


ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО  
**ВОТУМ**

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО «Экспертное бюро «Вотум»  
Иванова В.В.

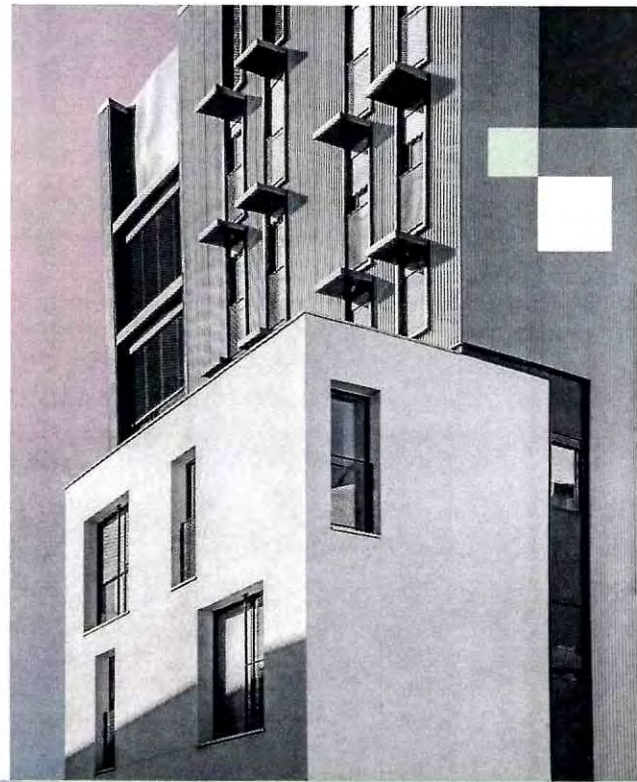

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

№ ЭФ3930/07-23

в области строительного-  
технического исследования,  
проведенного на объекте,  
расположенном по адресу:  
г. Москва, ул. Маресьева, д.  
7, корп. 3, кв. [REDACTED]

Основание: Договор № ЭФ3930/07-23 от 27.07.2023г. между  
«Вотум»

и ООО «Экспертное бюро

г. Москва  
2023 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ</b> .....	2
1.1 Место и время проведения исследования.....	2
1.2 Основания для производства исследования.....	2
1.3 Объект исследования.....	2
1.4 Сведения об экспертной организации .....	2
1.5 Документы, представленные специалисту для производства исследования.....	2
1.6 Сведения о лицах, присутствовавших при производстве исследования.....	2
1.7 Сведения о специалисте .....	2
1.8 Вопросы, поставленные перед специалистом.....	2
1.9 Технические средства контроля и измерения, используемые при проведении исследования. 3	
1.10 Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, специальная литература, использованные при проведении исследования .....	5
1.11 Этапы исследования .....	5
<b>2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ</b> .....	8
2.1 Сведения об объекте исследования.....	10
Исследование по Вопросу №1 .....	10
Исследование по Вопросу №2 .....	22
<b>3. ВЫВОДЫ</b> .....	26
<b>Приложение №1. Фотографии, сделанные специалистом во время осмотра.</b> .....	27
<b>Приложение №2. Копии документов, подтверждающих квалификацию специалиста.</b> .....	49
<b>Приложение №3. Сертификаты, свидетельства о поверке.</b> .....	54
<b>Приложение №4 Документы экспертной организации.</b> .....	62
<b>Приложение №5. Локальный сметный расчет.</b> .....	69
<b>Приложение № 6. Акт осмотра.</b> .....	86
<b>Приложение №7. Телеграмма.</b> .....	87

## 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

### *1.1 Место и время проведения исследования:*

Исследование проводилось по адресу: г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, кв.

Время проведения исследования: с 07.08.2023 г. по 14.08.2023 г.

Время производства натурального осмотра на объекте исследования: г. с 09 часов 00 минут по 10 часов 50 минут.

Адрес осуществления камеральной обработки данных: 119180, Россия, г. Москва, муниципальный округ Якиманка вн. тер. г., 1-й Голутвинский пер., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I/12.

### *1.2 Основания для производства исследования:*

Договор № ЭФ3930/07-23 от 27.07.2023г. между и ООО «Экспертное бюро «Вотум».

### *1.3 Объект исследования:*

Жилое помещение (квартира) № 1, расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, общей площадью 54,70 кв.м.

### *1.4 Сведения об экспертной организации:*

ООО «Экспертное бюро «Вотум», адрес местонахождения: 119180, Россия, г. Москва, муниципальный округ Якиманка вн. тер. г., 1-й Голутвинский пер., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I/12; ИНН/КПП 9706015686/ 770601001, ОГРН 1217700211750, e-mail: zakaz@votum.legal.

### *1.5 Документы, представленные специалисту для производства исследования:*

Договор участия в долевом строительстве №НЕК- от 01.07.2021г.

### *1.6 Сведения о лицах, присутствовавших при производстве исследования:*

О проведении специалистом натурального обследования заинтересованные стороны уведомлены экспертной организацией. На осмотре присутствовал собственник (см. Приложение №6). Застройщик ООО «СЗ «НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ», о дате и времени проведения натурального осмотра был уведомлен телеграммой (см. Приложение №7). Представитель застройщика на осмотр явился, присутствовать отказался.

### *1.7 Сведения о специалисте:*

**Кагарманов Руслан Сергеевич**, имеет высшее образование (Московский государственный строительный университет, диплом бакалавра по направлению «Строительство», по специальности «Строительство инженерных, энергетических, гидротехнических и природоохранных сооружений», диплом № 107705 0675444, рег.номер 11163Б, выдан 16.07.2020 года).

Стаж работы по экспертной специальности – 1 год.

Дополнительное образование:

- Сертификат соответствия судебного эксперта (Система добровольной сертификации негосударственных экспертных организаций и экспертов Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии «Палата судебных экспертов», рег. № РОСС RU. 31792.04ПСЭ0 от 22.11.2017, действителен с 24.03.2023г. по 24.03.2026г.)

- Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего о присвоении квалификации: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4

(четвертого) разряда» (ООО «Центр образовательной деятельности и лицензирования «МинМакс», №7718770293121, рег. номер 2211/61-01, выдан 09 ноября 2022 г., г. Москва).

- Диплом о профессиональной переподготовке (Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного образования»), по дополнительной профессиональной программе «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости», №37310048562, рег. номер. 195-2023, выдан 24 марта 2023 г., г. Иваново).

- Удостоверение о получении знаний и навыков по специализации «Ценообразование и сметное дело в строительстве» (НОЧУ дополнительного профессионального образования «Столичный институт экономики и финансов», №81216, от 16 марта 2023г.).

### **1.8 Вопросы, поставленные перед специалистом:**

1) Определить, соответствует ли качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартиры) № \_\_\_\_\_ расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, общей площадью 54,70 кв.м., условиям Договора участия в долевом строительстве №НЕК-\_\_\_\_\_ от 01.07.2021г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ, проектной документации и градостроительных регламентов.

2) В случае выявления такого несоответствия, определить объем обнаруженных дефектов и стоимость их устранения с учетом работ, материалов и иных необходимых затрат.

### **1.9 Технические средства контроля и измерения, используемые при проведении исследования.**

Для производства осмотра специалист применял следующие инструменты:

№	Внешний вид СИ	Характеристики СИ
1		<p><u>Цифровой уровень ADA ProLevel 60</u> для измерения углов наклона деталей и плоскостей. Удобно читаемый цифровой электронный дисплей отображает отклонение от горизонтали/вертикали, получая данные с встроенного датчика уклона (инклинометра). Для точной работы есть автоматическая калибровка. Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft. Для удобства работы есть режим “HOLD” - удержания результатов на дисплее и подсветка.</p> <p>Встроенные пузырьковые уровни позволяют вести двойной контроль совместно с электронным датчиком уклона или работать как с обычным уровнем. В основание встроены магниты для крепления на стальных конструкция.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Длина - 600 мм</li> <li>Точность измерений - 0,5 мм/м</li> </ul>
2		<p><u>Линейка металлическая</u> используется для точного определения линейных размеров. Гибкий инструмент позволяет также определить длину объектов незначительной кривизны. Изделие оснащено отверстием для подвешивания.</p>

3		<p><u>Влагомер - Testo 606-2.</u> Определяет точное измерение влажности древесины и строительных материалов благодаря заложенным в прибор характеристическим кривым для разных видов древесины, напр. бук, ель, лиственница, дуб, сосна, клен и строительных материалов.</p> <p>Внесен в Государственный реестр средств измерений РФ ФГИС «АРШИН»</p> <p>Измерение влажности и температуры окружающего воздуха долговечным сенсором влажности Testo.</p> <p>Измерение температуры (сенсор NTC)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Диапазон измерений - -10 ... +50 °C</li> <li>- Погрешность - ±0,5 °C</li> <li>- Разрешение - 0,1 °C</li> </ul> <p>Емкостный сенсор влажности</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Диапазон измерений - 0 ... 100 % ОВ</li> <li>- Погрешность - ±2,5 % ОВ</li> <li>- - Разрешение - 0,1 % ОВ</li> </ul>
4		<p><u>Лазерный дальномер RGK D60</u> — это современный прибор для измерения расстояний до 60 метров, обладающий широким набором. Точность измерений — не менее ±2 мм. Лазерный дальномер RGK D60 оснащён пузырьковым уровнем для гарантированного получения перпендикуляра. Блок памяти способен хранить до 100 полученных значений, включая длину, площадь и объём. С сохранёнными значениями можно выполнять те же арифметические действия, что и с текущими измерениями. Контрастный четырёхстрочный экран оснащён яркой подсветкой, которую можно включить и выключить отдельной кнопкой. В корпусе предусмотрены паз для закрепления ремешка на руку, винт на штатив 1/4" и откидная скоба. Измерение можно выполнять от четырёх разных точек отсчёта. Дальномер RGK D60 выполняет измерения: до задней кромки — при измерении длины помещения; до передней кромки — удобно осуществлять разметку; до винта — расстояние определяется точно до центра штатива; до конца откидной скобы — для определения расстояния из углов.</p>
5		<p><u>Измерительная рулетка BMI TAPE twoCOMP MAGNETIC 5 M</u></p> <p>Стальная лента длиной 5 метра оснащена защитным покрытием, а магнитный наконечник позволяет прикреплять край ленты к металлическим поверхностям.</p> <p>Прибор соответствует стандартам ISO 9001/2008, что подтверждается сертификатом качества.</p> <p>Технические характеристики:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Длина ленты - 5 м</li> <li>- Ширина ленты - 19 мм</li> <li>- Материал ленты - Сталь</li> <li>- Тип корпуса - Закрытый</li> <li>Материал корпуса - Пластик</li> </ul>
--	---

Также специалистом использовались:

- фиксирующая аппаратура – камера Xiaomi Redmi Note 8T 48 Мп с широкоугольным и телеобъективом;

- персональный компьютер;

- ручка, карандаш, планшет, листы бумаги.

Копии сертификатов о калибровке и поверке представлены в Приложении № 3.

Фотографии, сделанные во время натурного осмотра, приведены в Приложении № 1.

### ***1.10 Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, специальная литература, использованные при проведении исследования<sup>1</sup>:***

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями на 28 апреля 2023 года) (редакция, действующая с 9 мая 2023 года);

2) Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 2 июля 2013 года);

3) Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изм. на 1 июля 2021 года);

4) Федеральный закон Российской Федерации 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года);

5) Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 (с изменениями на 20 мая 2022 года)»;

6) АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». Пособие по обследованию строительных конструкций зданий;

7) «Дефекты и методы их устранения в конструкциях и сооружениях». И.А. Физдель, Издательство литературы по строительству, Москва 1970 г.;

8) «Методики исследования объектов судебной строительно-технической экспертизы». Гос. учреждение Рос. федер. центр судеб. экспертизы. Бутырин А.Ю., Луковкина О.В., Попов А.Н., Чудиёвич А.Р., Библиотека эксперта, Москва 2007;

9) «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам». Изд. ЦНИИпромзданий, Москва 2001;

<sup>1</sup> Указанные источники нормативно-технической документации использовались в той части и в той мере, которые были необходимы для решения поставленных вопросов. Указанный перечень не является исчерпывающим и представляет из себя справочную информацию характеризующую полноту исследований. Для проведения исследований использовались либо действующие нормативные документы, либо их актуализированные версии (СП- своды правил), документы прекратившие свое действие на территории РФ использовались справочно.

- 10) «Сборник методических рекомендаций по производству судебных строительно-технических экспертиз». Министерство Юстиции РФ ФЦСЭ. Под ред. А.Ю. Бутырина. Москва 2012;
- 11) «Сборник учебно-методических пособий по судебной строительно-технической экспертизе». Под ред. А.Ю. Бутырина, Библиотека эксперта, Москва 2011;
- 12) «Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе». 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма – ИНФРА-М, Е.Р. Россинская, 2019;
- 13) «Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы». И.Д. Городец., Бутырин А.Ю. 2006;
- 14) «Типология зданий и сооружений». Изд. центр «Академия». 2008 г. И.А. Синянский, Н.И. Манешина;
- 15) ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»;
- 16) ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия (с Поправкой)»;
- 17) ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»;
- 18) ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия (с Изменением N 1)»;
- 19) ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия»;
- 20) ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (с Изменением N 1, с Поправкой);
- 21) ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)»;
- 22) ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»;
- 23) ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»;
- 24) ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия (с Поправкой)»;
- 25) ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»;
- 26) ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой)»;
- 27) ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия»;
- 28) ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия (с Поправкой)»;
- 29) ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические условия»;
- 30) ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»;
- 31) ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (с Поправкой)»;
- 32) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- 33) СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменениями N 1,2,3)»;
- 34) СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные СНиП 31-01-2003»;

- 35) СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4)»;
- 36) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»;
- 37) СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1)»;
- 38) ГОСТ 25772-2021 «Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия (с Поправкой)»;
- 39) ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия»;
- 40) ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями N 1-4)»;
- 41) СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. ОКНА. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ (с Поправкой)».
- 42) ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия».
- 43) ГОСТ Р 59690-2021 «Материалы и комплектующие для натяжных потолков. Общие технические условия».
- 44) ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия (с Поправкой, с Изменением N 1)».
- 45) ТТК «Облицовка стен ванных комнат глазурованной плиткой».
- 46) ТУ 5772-005-88742502-2003 «Панели облицовочные. Элементы крепления и стыковки из поливинилхлорида для наружной отделки стен».
- 47) СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг (с изменениями на 14 апреля 2022 года)».
- 48) ГОСТ 24404-80 «Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения».
- 49) ГОСТ Р 59654-2021 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия».
- 50) ГОСТ 32548-2013 «Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия (Переиздание)».
- 51) ГОСТ 32412-2013 «Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия».
- 52) ГОСТ 23695-2016 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия (Переиздание)».
- 53) ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия (с Изменением N 1)».
- 54) ТР 114-01 «Технические рекомендации по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета».
- 55) ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой, с Изменением N 1)»

### ***1.11 Этапы исследования:***

- анализ предоставленной в распоряжение специалиста документации для составления плана проведения исследования, изучение правовых и технических документов, относящихся к обследуемому объекту;



- натурное обследование, выезд специалиста на исследуемый объект для визуального осмотра и изучения фактического состояния ремонтно-строительных работ, выполненных в рамках заключенного Договора;
- опрос заинтересованных лиц;
- анализ и систематизация результатов, полученных при изучении предоставленной в распоряжение специалиста документации, правовых и технических документов, относящихся к обследуемому объекту, сведений по результатам выезда на объект и визуального осмотра, а также изучения фактического состояния строительных работ, выполненных в рамках заключенного Договора;
- расчет стоимости ремонтно-отделочных работ в случае выявления недостатков строительных работ на объекте;
- формулирование выводов и оформление заключения специалиста.

## **2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ**

Настоящее заключение специалиста может быть использовано как доказательство в судебных или внесудебных спорах. Информировем, что после вступления в силу ст. 41 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности», судебно-экспертная деятельность может проводиться не только государственными, но и негосударственными экспертными учреждениями. Выводы, содержащиеся в настоящем заключении, ограничиваются следующими условиями:

- 1) Настоящее заключение достоверно в полном объеме в указанных в задании на исследование целях.
- 2) В процессе исследования предполагалось, что предоставленная Заказчиком информация является точной и достоверной. Специальная экспертиза (почерковедческая, техническая экспертиза документов, автороведческая и пр.) предоставленных документов не производилась.
- 3) ООО «Экспертное бюро «Вотум» гарантирует конфиденциальность информации, полученной в процессе исследования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Настоящее исследование проводилось в соответствии, с учетом положений и требований, данных специальной литературы, в частности по строительно-технической и документарной экспертизе, действующим положениям СП, ГОСТ, положений об охране труда и окружающей среды в Российской Федерации. При формулировке выводов по поставленным вопросам специалист использовал результаты специальных исследований и общепринятые научные положения, отраженные в специальной и методической литературе по строительству.

### **Основные методы проведения исследований:**

- 1) Анализ — метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования.
- 2) Синтез — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор. Синтез есть способ собрать целое из функциональных частей как антипод анализа — способа разобрать целое на функциональные части.
- 3) Измерительный метод, основанный на информации, получаемой с использованием технических измерительных средств. Результаты непосредственных измерений при необходимости приводятся путем соответствующих пересчетов к нормальным или стандартным условиям, например, к нормальной температуре, нормальному атмосферному

давлению и тому подобное. С помощью измерительного метода определяются значения показателей: масса изделия, сила тока, длина предмета, скорость автомобиля и др.

4) Регистрационный метод, основан на использовании информации, получаемой путем подсчета числа определенных событий, предметов или затрат, например, количества отказов изделия при испытаниях, числа частей сложного изделия (стандартных, унифицированных, оригинальных, защищенных авторскими свидетельствами или патентами и т.п.). Этим методом определяются показатели надежности, стандартизации и унификации, патентно-правовые и др.

5) Расчетный метод, при котором значения качественных или количественных показателей вычисляются по значениям параметров исследуемого образца, найденным другими методами. Для этого необходимо иметь теоретические или эмпирические зависимости показателей «качества» от параметров исследуемого образца.

6) Органолептический метод основан на анализе восприятия органов чувств (зрения, обоняния, осязания, слуха, вкуса) без применения технических измерительных или регистрационных средств. Органы чувств человека выдают информацию о соответствующих ощущениях. На основе имеющегося опыта проводится анализ этих ощущений и находится значение показателя качества. Поэтому точность метода зависит от квалификации, опыта и способностей лиц, проводящих оценку. При органолептическом методе могут использоваться технические средства, повышающие разрешающие способности органов чувств (лупа, микроскоп, слуховая трубка и т.п.). Метод широко применяется для определения качественных показателей исследуемого образца или объекта. Обычно органолептический метод применяется совместно с экспертным.

7) Документальный метод — это исследование учетных документов, различные исследования этих документов, проверка нормативной правовой базы их составления и т.д.

8) Экспертный метод - метод основанный на учете мнений специалистов-экспертов. Метод применяют в тех случаях, когда показатели качества не могут быть определены другими методами из-за недостаточного количества информации, необходимости разработки специальных технических средств и т.п. Экспертный метод является совокупностью нескольких различных методов, которые представляют собой его модификации. Известные разновидности экспертного метода применяются там, где основой решения является коллективное решение компетентных людей (экспертов). Квалификация эксперта определяется не только знанием предмета обсуждения. Учитываются специфические возможности эксперта. Например, в пищевой промышленности при оценке качества продуктов питания учитывают возможности эксперта воспринимать вкус, запах, а также его состояние здоровья. Эксперты, оценивающие эстетические и эргономические показатели качества, должны быть хорошо осведомлены в области художественного конструирования. При использовании экспертного метода для оценки качества формируют рабочую и экспертную группы. Рабочая группа организует процедуру опроса экспертов, собирает анкеты, обрабатывает и анализирует экспертные оценки.

При проведении исследования для подготовки ответа на вопросы был использован комбинированный метод, т.е. органолептический метод в совокупности с измерительным методом. Специалист, основываясь на своих знаниях, навыках и опыте, используя имеющуюся в его распоряжении информацию об объекте исследования, проанализировал количественные и качественные характеристики объекта исследования, провёл их идентификацию по основным признакам.

## 2.1 Сведения об объекте исследования

Жилое помещение (квартира) № \_\_\_\_\_ расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, общей площадью 54,70 кв.м.

Объект исследования представляет собой двухкомнатное помещение с прихожей, кухней, спальней, гостиной, ванной комнатой, санузлом. Квартира расположена в многоквартирном жилом доме. В квартире застройщиком выполнен ремонт (по отделке). В прихожей, кухне, спальне, гостиной выполнена отделка стен обоями под покраску, в ванной комнате, санузле стены облицованы керамической плиткой. Напольное покрытие в спальне, гостиной, прихожей, кухне выполнено из ламината, в ванной комнате, санузле – из керамической плитки.



Объект исследования, согласно общему осмотру, готов к эксплуатации. Необходимо отметить, что на момент освидетельствования объекта экспертизы (квартиры) используется для проживания людей.

## Исследование по Вопросу №1

**Вопрос 1: Определить, соответствует ли качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартиры) № \_\_\_\_\_ расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, общей площадью 54,70 кв.м., условиям Договора участия в долевом строительстве №НЕК-\_\_\_\_\_ от 01.07.2021г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ, проектной документации и градостроительных регламентов.**

Для ответа на данный вопрос специалист проанализировал документацию, предоставленную заказчиком, а также произвёл натурный осмотр объекта исследования. В связи с тем, что ООО «СЗ «НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ», согласно Договора участия в долевом строительстве №НЕК-\_\_\_\_\_ от 01.07.2021г., является застройщиком и производит выпуск строительной продукции, то к квартире, которая является предметом Договора, применяются

строительные нормативы (ГОСТ, СП, проектная документация и т.д.). Основными документами, которые регламентируют качество строительной продукции являются:

- *Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 N 384-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013 года);*

- *Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями на 28 апреля 2023 года) (редакция, действующая с 9 мая 2023 года);*

- *Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 (с изменениями на 20 мая 2022 года)».*

С учетом того, что объектом исследования является квартира с **отделкой**, то есть полностью пригодная к эксплуатации, для отделочных работ также применяется документ, который регламентирует качество отделочных работ и с помощью которого можно определить недостатки при отделочных работах, а именно:

- *СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.*

Кроме того, специалист проанализировал информацию, содержащуюся в Договоре участия в долевом строительстве №НЕК- от 01.07.2021г. В соответствии с Приложением №2 к указанному Договору, в Объекте долевого строительства выполняются следующие отделочные работы по помещениям:

Кухня:

- стены: обои;
- потолки: окраска либо натяжной потолок;
- полы: керамическая плитка либо ламинат (вид применяемого материала определяется Застройщиком самостоятельно в зависимости от конструктивных особенностей помещения);
- столярные изделия: дверь (за исключением квартир, объединенных с кухонными зонами);

Комнаты:

- стены: обои;
- потолки: окраска либо натяжной потолок;
- полы: ламинат;
- столярные изделия: дверь.

Коридор:

- стены: обои;
- потолки: окраска либо натяжной потолок;
- полы: керамическая плитка либо ламинат (вид применяемого материала определяется Застройщиком самостоятельно);
- входная дверь.

Ванна, санузел:

- стены: окраска и/или частичная отделка керамической плиткой;
- потолки: окраска либо натяжной потолок;

- полы: частичная отделка керамической плиткой (за исключением мест под ванной и иных скрытых мест);
- столярные изделия: дверь;
- сантехнические изделия: ванна, раковина, унитаз, смеситель;
- Приборы учета (счетчики) холодного и горячего водоснабжения;
- Полотенцесушитель.

Лоджия и/или Балкон (при наличии)

- Остекление (частичное, в объеме, определяемом Застройщиком);
- Полы, стены, потолок - без отделки.

Согласно раздела 5 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (Этапы проведения обследований и состав работ):

*«5.1 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как правило, в три связанных между собой этапа:*

- *подготовка к проведению обследования;*
- *предварительное (визуальное) обследование;*
- *детальное (инструментальное) обследование.*

*5.2 Состав работ и последовательность действий по обследованию конструкций независимо от материала, из которого они изготовлены, на каждом этапе включают:*

*Подготовительные работы:*

- *ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий;*
- *подбор и анализ проектно-технической документации;*
- *составление программы работ (при необходимости) на основе полученного от заказчика технического задания. Техническое задание разрабатывается заказчиком или проектной организацией и, возможно, с участием исполнителя обследования. Техническое задание утверждается заказчиком, согласовывается исполнителем и, при необходимости, проектной организацией - разработчиком проекта задания.*

*Предварительное (визуальное) обследование:*

- *сплошное визуальное обследование конструкций зданий и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация.*

*Детальное (инструментальное) обследование:*

- *работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;*
- *инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;*
- *определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;*
- *измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении;*
- *определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтового основания;*
- *определение реальной расчетной схемы здания и его отдельных конструкций;*
- *определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;*
- *расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;*
- *камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;*

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;
- составление итогового документа (акта, заключения, технического расчета) с выводами по результатам обследования;
- разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью выполнения работ.

Некоторые из перечисленных работ могут не включаться в программу обследования в зависимости от специфики объекта исследования, его состояния и задач, определенных техническим заданием. Исходя из вышеизложенных этапов, специалист произвел детальное (инструментальное) обследование с применением специальной приборной базы. Согласно детального (инструментального) обследования объекта исследования специалист выявил ряд дефектов.

*Дефект* – отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). Указанный термин дан в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений зданий» / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2005.

Ниже в Таблице №1 специалист описал выявленные им дефекты, несоответствия действующей нормативной документации (СП, ГОСТ) в области строительства на момент осмотра Квартиры.

Таблица №1. Несоответствие дефектов действующим нормативным документам.

№ п/п	Описание дефекта	Нарушение требований Нормативных документов (СП, ГОСТ, и тд)
1	Стены, оклеенные обоями, в спальне, кухне, прихожей, гостиной имеют отклонения по вертикали. Отклонения составляют 6-8 мм. Фото №7-10.	<b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: 7.3.7 После проведения штукатурных и (или) шпатлевочных отделочных работ качество полученной поверхности должно соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 7.5.» (таблица 7.5 представлена ниже)</b> «7.2.13 Качество производства штукатурных работ должно соответствовать требованиям заказчика. В случае если критерии оценки качества штукатурных работ заказчиком не установлены, допускается руководствоваться требованиями, установленными в таблице 7.4, а для СФТК - требованиями, установленным СП 293.1325800. Категорию качества поверхности устанавливает проектом и оценивают согласно таблице 7.5. Категории качества поверхности К3 и К4 устанавливает только для высококачественной штукатурки.» (таблица 7.4 представлена ниже)
2	Стены, облицованные керамической плиткой, в ванной комнате, санузле имеют отклонения по уровню вертикальности. Отклонения составляют	<b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.4.17 При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 7.6. - Из керамических, стеклокерамических и других изделий: отклонения по</b>

	5 мм. Фото №11-12.	<i>вертикали – внутренняя облицовка не более 1,5 мм на 1 м длины (4 на этаж)» (таблица 7.6 представлена ниже)</i>
3	Устройство <b>напольного покрытия из ламината</b> имеет превышение отклонения поверхности от плоскости в спальне, гостиной, кухне, прихожей. При измерении уровнем превышение составило 5-7 мм. Фото №13-16.	<b>Нарушение требований ТР 114-01 «Технические рекомендации по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета»:</b> <i>«7.3 Горизонтальность и ровность поверхности покрытия пола проверяют уровнем и контрольной 2-х метровой рейкой. Величина просвета между рейкой и покрытием при проверке в любом направлении не должна превышать 2 мм.»</i> <b>Нарушение требований «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта»:</b> <i>«11.17. Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Отклонение поверхности покрытия пола от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должна превышать для покрытий: - полимерных мастичных, дощатых, паркетных, из ламината, из линолеума, из рулонных материалов на основе синтетических волокон - 2 мм»</i>
4	Устройство <b>напольного покрытия из керамической плитки</b> в ванной комнате, санузле имеет превышение отклонения поверхности от плоскости. При измерении уровнем превышение составило 5-6 мм. Фото №17-18.	<b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»:</b> <i>«8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15.» (таблица 8.15 представлена ниже)</i>
5	<b>Окрашенные откосы оконных блоков ПВХ</b> в кухне, спальне, №1 и №2 в гостиной выполнены с дефектами (трещины, отлупы). Фото №19-22.	<b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»:</b> <i>«7.5.1 Малярные работы проводят по основаниям, соответствующим требованиям таблицы 7.4. Требования к категории поверхности - согласно таблице 7.5.» - (таблицы 7.4 и 7.5 представлены ниже)</i> <i>«7.5.5 Приемка малярных работ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными заказчиком. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 7.7.</i> <b>Полосы, пятна, подтеки, брызги - Не допускаются для жилых и общественных помещений. Должны быть незаметны при сплошном визуальном осмотре с расстояния 2 м от поверхности для подсобных и технических помещений» - из Таблицы 7.7 - Требования к качеству выполненных малярных работ.</b>
6	<b>Профиль ПВХ оконных блоков</b> в кухне, спальне, №1 и №2 в гостиной имеет дефекты (царапины, сколы, притертости).	<b>Нарушение требований ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»:</b> <i>«4.2.8 Показатели внешнего вида профилей: цвет, блеск, качество поверхностей - должны соответствовать цвету, блеску и качеству поверхностей образцов-эталонов... Дефекты на лицевых поверхностях:</i>

	Фото №23-32.	<p>риски, раковины, вздутия, царапины, трещины, пузырьки и т. д., видимые невооруженным глазом, не допускаются... »</p> <p>«4.2.15 Лицевые поверхности главных профилей должны быть покрыты защитной пленкой, предохраняющей их от повреждений при транспортировании, а также при производстве и монтаже оконных и дверных блоков. Ширина защитной пленки устанавливается в рабочей документации изготовителя».</p> <p>«7.1 Условия упаковки, транспортирования и хранения должны обеспечивать предохранение профилей от загрязнения, деформаций и механических повреждений».</p> <p><b>Нарушение требований ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой)»:</b> «5.9.3. Угловые и T-образные соединения профилей должны быть герметичными. Допускается уплотнение механических соединений ПВХ-профилей атмосферостойкими эластичными прокладками. Зазоры до 0,5 мм допускается заделывать специальными герметиками, не ухудшающими внешний вид изделий и обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги».</p>																	
7	<p><b>На лицевой поверхности подоконной доски</b> в гостиной, кухне имеются дефекты (царапины). Фото №33-34.</p>	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»:</b> «4.2.8 Показатели внешнего вида профилей: цвет, блеск, качество поверхностей - должны соответствовать цвету, блеску и качеству поверхностей образцов-эталонов... Дефекты на лицевых поверхностях: риски, раковины, вздутия, царапины, трещины, пузырьки и т. д., видимые невооруженным глазом, не допускаются... ».</p> <p><b>Нарушение требований СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»:</b></p> <table border="1" data-bbox="608 1290 1441 1570"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Наименование показателя</th> <th rowspan="2">Требования</th> <th colspan="2">Вид контроля</th> <th rowspan="2">Метод контроля</th> </tr> <tr> <th>примос-даточный</th> <th>периоди-ческий</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Подоконники</b></td> </tr> <tr> <td>Качество лицевой поверхности</td> <td>Отсутствие повреждений, сколов, вмятин, вздутий, отслоений</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>Визу-альный осмотр</td> </tr> </tbody> </table> <p>Из Таблицы №3 – Перечень показателей, проверяемых при контроле качества монтажа оконных блоков.</p>	Наименование показателя	Требования	Вид контроля		Метод контроля	примос-даточный	периоди-ческий	<b>Подоконники</b>					Качество лицевой поверхности	Отсутствие повреждений, сколов, вмятин, вздутий, отслоений	+	+	Визу-альный осмотр
Наименование показателя	Требования	Вид контроля			Метод контроля														
		примос-даточный	периоди-ческий																
<b>Подоконники</b>																			
Качество лицевой поверхности	Отсутствие повреждений, сколов, вмятин, вздутий, отслоений	+	+	Визу-альный осмотр															
8	<p><b>Металлический отлив оконного блока ПВХ</b> в гостиной, спальне имеет дефекты (загрязнение малярными составами). Фото № 35-36.</p>	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)»:</b> «Отлив, дождезащитный профиль - деталь, предназначенная для отвода дождевой воды и защищающая оконную конструкцию от ее проникновения.</p> <p>6.4 Приемочный контроль качества готовой продукции проводят поштучно, методом сплошного контроля, при этом проверяют:</p> <p>-внешний вид (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом);»</p>																	
9	Отклонение коробки	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические</b></p>																	



	дверного блока в кухне, ванной комнате. Фото №37-38.	<b>условия:</b> «5.3.4 Дверные блоки, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму. Отклонения от плоскостности и прямолинейности сторон дверных блоков и их сборочных единиц не должны превышать, мм, по высоте, ширине и диагонали элементов: - до 1000 мм - 1,0; - св. 1000 до 1600 мм - 1,0; - св. 1600 до 2500 мм - 2,0; - св. 2500 мм - 3,0.»
10	Коробка деревянного дверного блока имеет дефекты (сколы) в санузле. Фото №39.	<b>Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия:</b> «7.3.3 Внешний вид дверных блоков оценивают визуально путем сравнения с образцами-эталоном, утвержденными руководителем предприятия-изготовителя, при естественном или искусственном рассеянном освещении не менее 300 лк. Визуальную оценку проводят с расстояния 1,5 м от вертикально установленного дверного блока» <b>«Приложение В (обязательное). Нормы ограничения пороков и дефектов обработки древесины. Таблица В.1</b> <b>Механические повреждения:</b> заруб, затил, отщеп, скол, вырыв, задир, вмятины, выхват, выщербины - не допускаются на лицевых поверхностях»
11	Элементы дверного блока соединены (коробка) не надежно в гостиной. Фото №40.	<b>Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия:</b> «5.4.8 Установка и крепление наличников, доборных элементов, нащельников, обкладок, реек, раскладок и других элементов облицовки и отделки должны обеспечивать надежное соединение с сопрягаемыми элементами проема и конструкции дверного блока под действием нагрузок, возникающих при нормальных условиях эксплуатации. Наличники и доборные элементы должны полностью перекрывать монтажные швы.» <b>Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия:</b> «5.3.7 Зазоры в местах неподвижных соединений элементов дверных блоков не должны быть более 0,3 мм.»
12	Дефекты (царапина, скол) на лицевой поверхности полотна деревянного дверного блока в спальне, гостиной, кухне. Фото № 41-43.	<b>Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия:</b> «7.3.3 Внешний вид дверных блоков оценивают визуально путем сравнения с образцами-эталоном, утвержденными руководителем предприятия-изготовителя, при естественном или искусственном рассеянном освещении не менее 300 лк. Визуальную оценку проводят с расстояния 1,5 м от вертикально установленного дверного блока». <b>«Приложение В (обязательное) Нормы ограничения пороков и дефектов обработки древесины</b> <b>Механические повреждения:</b> а) риски, волнистость, ворсистость, миристость, бахрома, заусенец, непрофрезеровка, гребешок; б) заруб, затил, отщеп, скол, вырыв, задир, вмятины,

		выхват, выщербины. Не допускаются на лицевых поверхностях.»
13	Неплотное прилегание дверного наличника к стене в кухне, спальне, ванной комнате, гостиной. Фото №44-47.	Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»: «5.4.8 Установка и крепление наличников, доборных элементов, нащельников, обкладок, реек, раскладок и других элементов облицовки и отделки должны обеспечивать <b>надежное соединение</b> с сопрягаемыми элементами проема и конструкции дверного блока под действием нагрузок, возникающих при нормальных условиях эксплуатации. Наличники и доборные элементы должны <b>полностью перекрывать</b> монтажные швы.»
14	Затирка настенной плитки в ванной комнате, санузле выполнена с нарушениями (каверны, разность ширины шва). Фото №48-49.	Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.4.13 Швы облицовки должны быть <b>ровными</b> , одинаковой ширины...». Нарушение требований ТР 98-99 «Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток»: «6.3. Швы между плитками должны быть заполненными, <b>прямолинейными</b> , <b>взаимно перпендикулярными</b> и одинаковой ширины. 6.4. Отклонения ширины шва от заданной проектом +/- 0,5 мм.»
15	Ламинат прогибается при ходьбе в спальне, гостиной.	Нарушение требований СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением N 1,2)»: «4.11 Полы в зданиях должны обладать необходимой несущей способностью и не быть "зыбкими". Прогобы при сосредоточенной нагрузке, равной 2 кН в жилых зданиях, 5 кН в общественных, административных, производственных и складских зданиях не должны превышать 2 мм.»
16	Напольная керамическая плитка имеет изменение звучания (пустоты) при простукивании в ванной комнате, санузле.	Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «8.9.1 Плиты (плитки) цементно-бетонные, цементно-песчаные, мозаично-бетонные, асфальтобетонные, керамические (керамогранитные), каменно-литые, чугунные, стальные, из природного камня и унифицированных блоков следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раствора, бетона, горячих мастик, готовых к применению материалов на водорастворимых полимерах и реактивных смолах... В случае использования в качестве прослойки тиксотропных материалов допускается дополнительно наносить данный материал на обратную сторону укладываемого элемента для обеспечения <b>беспустотной</b> укладки.»
17	Затирка напольной плитки выполнена с нарушениями в ванной комнате, санузле: разность ширины шва,	Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.4.13 Швы облицовки должны быть <b>ровными</b> , одинаковой ширины...». Нарушение требований ТР 98-99 «Технические

	<p>наличие монтажных элементов. Фото №50-51.</p>	<p><b>рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноформатных керамических плиток:</b> «6.3. Швы между плитками должны быть заполненными, прямолинейными, взаимно перпендикулярными и одинаковой ширины. 6.4. Отклонения ширины шва от заданной проектом +/- 0,5 мм.»</p>
18	<p><b>Загрязнения</b> на поверхности ламината в спальне, кухне, гостиной. Фото №52-54.</p>	<p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»:</b> «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15* «Требования к готовому покрытию пола» (таблица 8.15 представлена ниже)</p>
19	<p><b>Читаемые швы обоев</b> в спальне, кухне, гостиной. Фото № 55-57.</p>	<p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»:</b> «7.6.9 Второе обойное полотно приклеивают вдоль первого стык, разравнивание складок и удаление пузырей проводят по процедуре, описанной в 7.6.8. Процедуру повторяют до заклейки всей рабочей поверхности. 7.6.15 Приемку работ проводят путем визуального осмотра. При визуальном осмотре на поверхности, оклеенной обоями, не допускают воздушные пузыри, замятины, пятна и другие загрязнения, а также доклейки и отслоения.»</p>
20	<p>Дефект монтажа декоративного молдинга крепления натяжного потолка в гостиной, загрязнение и дефект полотна натяжного потолка в спальне, кухне (видны инженерные сети). Фото №58-60.</p>	<p><b>Нарушение требований ГОСТ Р 59690-2021 «Материалы и комплектующие для натяжных потолков. Общие технические условия.»:</b> «5.5 На лицевой поверхности полотна не допускаются посторонние включения, царапины, раковины, складки, полосы, искажение рисунка, видимые с расстояния 1 м от поверхности пленки. Полотно не должно иметь сквозных отверстий и разрывов. 5.7 Декоративный молдинг (вставка, заглушка) изготавливают из ПВХ-композиции методом экструзии по ГОСТ 19111. Варианты исполнения декоративных молдингов приведены на рисунке 3.</p> <p style="text-align: center;"><b>Рисунок 3 — Декоративные молдинги</b></p>  <p>а — Т-образный пристенный профиль, вариант 1; б — Т-образный пристенный профиль, вариант 2; в — Т-образный пристенный профиль, вариант 3; г — соединительный профиль — заглушка; д — Л-образный пристенный профиль»</p> <p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»:</b> «7.8.2 Поверхность натяжного потолка должна иметь однородный цвет, быть ровной, без складок, разрывов,</p>

		<i>трещин, следов и отпечатков использованных материалов. Не должно быть щелей между стенами и потолком.</i>
21	<b>Отопительный прибор</b> имеет дефект защитного кожуха в спальне, гостиной (скол, царапина). Фото № 61-62.	<b>Нарушение требований ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические условия»:</b> «5.5 Отопительные приборы, в том числе места сварных или паяных соединений нагревательных элементов, должны иметь термостойкое защитное или защитно-декоративное покрытие всей поверхности, контактирующей с воздухом, обеспечивающее их защиту от коррозии, за исключением поверхностей резьбовых соединений. На поверхностях резьбовых соединений не допускается наличие декоративных покрытий (порошковая краска, декоративные покрытия на жидкой основе). Качество покрытия поверхностей, видимых при эксплуатации отопительных приборов, должно быть не ниже класса IV по ГОСТ 9.032. Качество покрытия поверхностей для чугунных радиаторов и нагревательных элементов конвекторов, эксплуатируемых с защитно-декоративным кожухом, - не ниже класса VI по ГОСТ 9.032.»
22	<b>Коробка входной металлической двери</b> имеет дефекты (царапины). Фото №63-64.	<b>Нарушение требований ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»:</b> «5.3.11 Внешний вид изделий: цвет, допустимые дефекты поверхности облицовочных материалов и окрашенных элементов (риски, царапины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя. Различия в цвете, глянце и дефекты поверхности, видимые невооруженным глазом с расстояния 0,6-0,8 м при естественном освещении не менее 300 лк, <b>не допускаются.</b> »

На момент проведения осмотра зафиксировано, что не работает система умный дом на кухне, а также не проведена обработка от грызунов.

Таблица 7.5\* - Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного покрытия

Категория качества поверхности	Назначение	Требования (методы контроля)
K2	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются обычные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ элементами площадью не менее 900 кв.см, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна более 1 мм, для нанесения структурных красок и покрытий, для приклейки тяжелых обоев)	Допускается наличие царапин, раковин, задиров глубиной не более 1 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются (контроль проводят при необходимости доведения качества поверхности до категории K3)
K3	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются повышенные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ мелкоштучными и прозрачными элементами, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна менее 1 мм, для нанесения неструктурных матовых красок и покрытий, приклейки обоев на бумажной и флизелиновой основе)	Допускается наличие следов от абразива, применяемого при шлифовке поверхности, но не глубже <b>0,3 мм</b> (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются, но они должны быть значительно меньше, чем при качестве поверхности категории K2 (контроль проводят при необходимости)
K4	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются максимальные требования (поверхности предназначены под выполнение	Не допускается наличие <b>царапин, раковин, задиров, следов от инструмента</b> (сплошной визуальный

	<p>глянцевых облицовок, например под металлические или виниловые обои, нанесение глянцевых красок, глазури или покрытий, нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки или для иных видов высококачественного глянца, для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями с применением аппаратов безвоздушного распыления, для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев). Рекомендуется при установке бокового освещения</p>	<p>осмотр). <b>Тени</b> от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника)</p>
--	---	--

Таблица 7.4\* - Требования к оштукатуренным основаниям

Контролируемый параметр	Предельное отклонение	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
<b>Простая штукатурка</b>		
Отклонение от вертикали	Не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 70 кв. м, журнал работ
Отклонение по горизонтали	Не более 3 мм на 1 м	
Неровности поверхности плавного очертания	На площади 4 кв.м. не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент	Измерительный, лекалом, не менее трех измерений на элемент, журнал работ
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали	Не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 70 кв.м., журнал работ
Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения	Не более 10 мм на весь элемент	
Отклонение ширины откоса от проектной	Не более 5 мм	
<b>Улучшенная штукатурка</b>		
Отклонение от вертикали	<b>Не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения</b>	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 кв.м., журнал работ
Отклонение по горизонтали	<b>Не более 3 мм на 1 м</b>	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 кв.м., журнал работ
Неровности поверхности плавного очертания	Не более 2 шт., глубиной (высотой) до 3 мм	Измерительный, лекалом, не менее трех измерений на элемент, журнал работ
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали	На площади 4 кв.м. не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 кв.м., журнал работ
Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения	Не более 7 мм на весь элемент	
Отклонение ширины откоса от проектной	Не более 3 мм	
<b>Высококачественная штукатурка</b>		
Отклонение от вертикали	Не более 0,5 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю высоту помещения	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти

Отклонение по горизонтали	Не более 1 мм на 1 м	измерений на каждые 50 кв.м., журнал работ
Неровности поверхности плавного очертания	Не более 2 шт., глубиной (высотой) до 1 мм	Измерительный, лекалом, не менее трех измерений на элемент, журнал работ
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали	На площади 4 кв.м. не более 2 мм на 1 м, но не более 5 мм на весь элемент	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 кв.м., журнал работ
Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины	Не более 4 мм на весь элемент	
Отклонение ширины откоса от проектной	Не более 2 мм	

Таблица 8.15\* - Требования к готовому покрытию пола

Наименование параметра	Допустимое значение	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке двухметровой контрольной рейкой: - песчаных, мозаично-бетонных, асфальтобетонных, керамических, каменных, шлакоситалловых	Не более 4 мм	Измерительный, контроль двухметровой рейкой, не менее девяти измерений на каждые 50-70 кв.м. поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
- поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий и покрытий из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон из поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит	Не более 2 мм	
Зазоры между досками дощатого покрытия	Не более 1 мм	Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
Зазоры между паркетными досками и паркетными щитами	Не более 0,5 мм	
Зазоры между смежными планами штучного паркета	Не более 0,2 мм	
Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток	Не допускаются	Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному		

Таблица 2\* – Критерии соответствия для лакокрасочных покрытий

Класс покрытия	Наименование дефекта	Норма для покрытий								
		гладких						рельефных		
		однотонных						рисунчатых (молотковых)	"Муаровых"	"Шагреновых"
		высокоглянцевых	глянцевых, в том числе с лессирующим эффектом	полуглянцевых	полуматовых	матовых	глубокоматовых			
I	Включения: количество,		-	-	4	-	-	-	-	
	шт/м <sup>2</sup> , не более	Не допускаются	-	-	0,2	-	-	-	-	
	размер, мм, не более		-	-	100	-	-	-	-	
	расстояния между включениями, мм, не менее									
	Шагрень	Не допускается	-	-	Не допускается	-	-	-	-	
	Потеки	Не допускаются	-	-	Не	-	-	-	-	

						допускаются						
	Штрихи, риски	Не допускаются		-	-	Не допускаются	-	-	-	-		
	Волнистость, мм, не более	Не допускается		-	-	Не допускается	-	-	-	-		
	Разнооттеночность	Не допускается		-	-	Не допускается	-	-	-	-		
II	Включения: количество,	4	4	4	4	8	8	8	8	8		
	шт/м, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	размер, мм, не более	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	расстояние между включениями, мм, не более											
	Шагрень	Допускается незначительная					Не нормируется					
	Штрихи, риски	Допускаются отдельные										
	Потеки	Не допускаются										
	Волнистость, мм, не более	Не допускается										
III	Разнооттеночность	Не допускается										
	Неоднородность рисунка	Не нормируется					Не допускается					
	Включения:	-	10	15	15	25	25	25	25	25	25	
	количество, шт./м, не более	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	размер, мм, не более	-	50	50	50	30	30	30	30	30	30	
	расстояние между включениями, мм, не менее	-										
	Шагрень	-	Допускается незначительная					Не нормируется				
	Потеки	-	Не допускаются									
Штрихи, риски	-	Допускаются отдельные										
Волнистость, мм, не более	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Разнооттеночность	-	Не допускается										
Неоднородность рисунка	-	Не нормируется					Не допускается					

**ВЫВОД:** Исходя из исследования по данному вопросу, специалист сделал вывод о том, что качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартиры) № \_\_\_\_\_ расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: Г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, общей площадью 54,70 кв.м., **не соответствует** условиям Договора участия в долевом строительстве №НЕК-\_\_\_\_\_ от 01.07.2021г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

## Исследование по Вопросу №2

**Вопрос 2:** В случае выявления такого несоответствия, определить объем обнаруженных дефектов и стоимость их устранения с учетом работ, материалов и иных необходимых затрат.

Для ответа на данный вопрос специалист проанализировал исследовательскую часть ответа на первый вопрос, а также произвёл натурный осмотр объекта исследования: жилое помещение (квартира) № \_\_\_\_\_ расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: Г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, общей площадью 54,70 кв.м. Также, специалистом проводились измерения всех геометрических характеристик в квартире по итогам данных фиксации дефектов.

Согласно полному и всестороннему исследованию, специалист обнаружил на объекте исследования (жилое помещение (квартира) № \_\_\_\_\_ расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: Г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, общей площадью 54,70 кв.м., недостатки (дефекты), которые позволяют сделать вывод о несоответствии объекта условиям Договора участия в долевом строительстве №НЕК-\_\_\_\_\_ от 01.07.2021г., требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Выявленные дефекты указаны в исследовательской части ответа на первый вопрос данного Заключение специалиста.

На элементах отделочных слоёв имеется некоторый физический износ. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса РФ» п.13. износ материалов не учитывается: *«...Если для устранения поврежденных имущества истца использовались или будут использоваться новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться, по сравнению с его стоимостью до повреждения.»*

Также, необходимо указать, что при расчёте стоимости специалист вводил дополнительные поправочные коэффициенты в виду того, что при демонтаже/монтаже отделочных конструкций в квартире имеется мебель, имеется электропроводка, живут люди и т.д. и данные условия усложняют выполнение работ по восстановительному ремонту, согласно принятой методике. Указанная методика «заложена» в программный комплекс «Smeta.ru».

Указанные поправочные коэффициенты принимаются в соответствии с *Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 года N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».*

При ремонте и реконструкции работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе, возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемых зданиях и сооружениях) и не учтенные в ТЕРр, принимаются по соответствующим Территориальным единичным расценкам ТЕР (кроме расценок сборника №46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений") на строительные работы с применением коэффициентов:

- к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей - 1,15,
- к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов)-1,25.

Уточнения сметных показателей, связанные с порядком применения ТЕРр и учетом коэффициентов на условия работ осуществляется при составлении смет, при этом приводятся ссылки (в сметном расчёте) на соответствующие пункты технических частей соответствующих Сборников ТЕРр и Общих Указаний.

При производстве ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, и в других усложняющих условиях проведения ремонтно-строительных работ к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе оплате труда рабочих, обслуживающих машины, следует применять коэффициенты, учитывающие эти условия.

Таблица на применение поправочных коэффициентов



№ п/п	Условия производства работ	Коэффициенты к расценкам сборников ТЕР (кроме сборника ТЕР № 1)	Коэффициенты к расценкам сборника ТЕР № 1 и сборников ТЕРр
1	2	3	4
3	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в <u>стесненных условиях</u> : с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, <u>мебель</u> и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.	1,35	1,15

Далее, специалист составил смету на устранение выявленных им дефектов и несоответствий по результатам полного и всестороннего исследования.

При составлении сметы использовался Программный комплекс "Smeta.ru" версия 11.X, Ключ № FSTS-0067 508. Сметный расчёт был выполнен в расценках Территориальная сметно-нормативная база для Московской области (ТСНБ-2001 МО) в редакции 2014 г. ТСНБ-2001 МО предназначена для составления сметной документации для объектов, расположенных на территории Московской области. ТСНБ-2001 Московской области в редакции 2014 года утверждена и внесена в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 21.09.2015 года № 675/пр.

Расценки ФЭР (Федеральные единичные расценки) специалистом не брались во внимание так как они применяются на территории РФ, если заказ Государственного федерального значения, и оплачивается с Федерального Казначейства.

Специалист рассчитал сметную стоимость восстановительного ремонта квартиры по устранению дефектов, которые были выявлены специалистом по результатам натурного осмотра квартиры. Для этого он измерял при натурном осмотре объёмы объекта исследования. Таким образом, в смете указаны те объёмы и те работы, которые необходимы для устранения выявленных специалистом дефектов (см. локальный сметный расчёт Приложение №5).

Согласно нормативов, установленных в Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями на 28 апреля 2023 года) (редакция, действующая с 9 мая 2023 года):

*«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе*

*32) сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве;*

*33) сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм;*

Далее, специалист, согласно Постановлению Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 (с изменениями на 20 мая 2022 года)» разъясняет, что все применяемы нормативы при производстве исследования по вопросам в данном Заключении специалиста применены им на основании обязательных требований

строительных норм и правил в связи с тем, что они напрямую связаны с *Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)* (Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ).

В исследовательской части ответов на вопросы Заключения специалист ссылался только на данные, указанные в обязательных требованиях строительных и градостроительных норм, и правил.

**ВЫВОД:** На основе подготовленного локального сметного расчета специалистом установлено, что стоимость устранения выявленных строительных недостатков в жилом помещении (квартире) № \_\_\_\_\_ расположенном в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, общей площадью 54,70 кв.м., составляет: **697 344 (Шестьсот девяносто семь тысяч триста сорок четыре) рубля 70 копеек**. Локальный сметный расчет представлен в Приложении №5.

### 3. ВЫВОДЫ

**ВОПРОС №1: Определить, соответствует ли качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартиры) № расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: Г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, общей площадью 54,70 кв.м., условиям Договора участия в долевом строительстве №НЕК от 01.07.2021г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ, проектной документации и градостроительных регламентов.**

Качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартиры) № расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, общей площадью 54,70 кв.м., **не соответствует** условиям Договора участия в долевом строительстве №НЕК от 01.07.2021г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. Перечень выявленных дефектов и несоответствий нормативным требованиям указан в Таблице №1 исследовательской части по вопросу №1.

**ВОПРОС №2: В случае выявления такого несоответствия, определить объем обнаруженных дефектов и стоимость их устранения с учетом работ, материалов и иных необходимых затрат.**

При проведении натурного осмотра в Квартире выявлены дефекты строительно-отделочных работ, перечень которых указан в Таблице №1 исследовательской части по вопросу №1. Специалистом подготовлен локальный сметный расчет с указанием наименований работ и их объемов, необходимых для устранения выявленных специалистом дефектов. На основе подготовленного локального сметного расчета специалистом установлено, что стоимость устранения выявленных строительных недостатков в жилом помещении (квартире) № расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, общей площадью 54,70 кв.м., составляет:

**697 344 (Шестьсот девяносто семь тысяч триста сорок четыре) рубля 70 копеек.**

**Специалист:**



**Кагарманов Р.С.**

**Приложение №1. Фотографии, сделанные специалистом во время осмотра.**

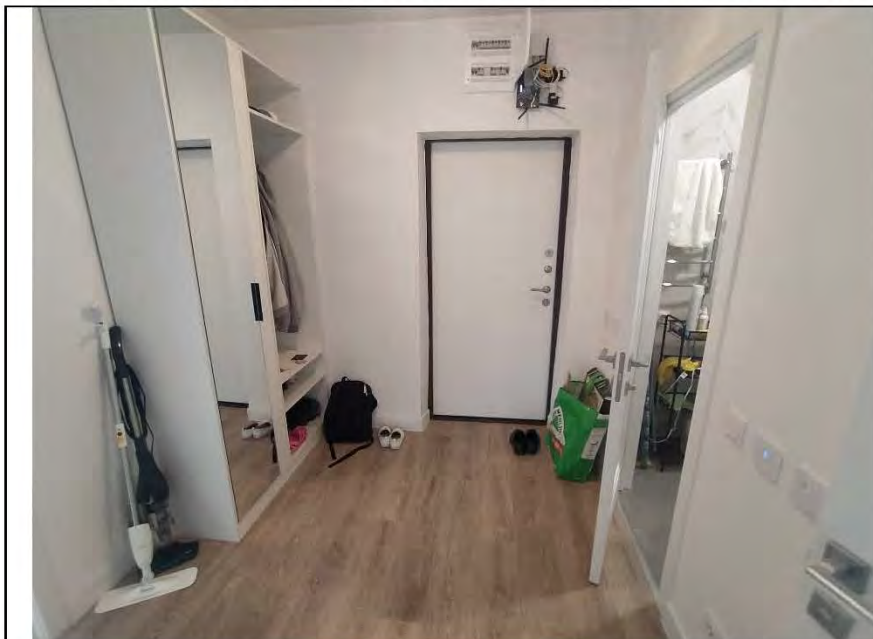


Фото №1.  
Общий вид прихожей.



Фото №2.  
Общий вид кухни.



Фото №3.  
Общий вид спальни.



Фото №4.  
Общий вид гостиной.



Фото №5.  
Общий вид ванной  
комнаты.



Фото №6.  
Общий вид санузла.



Фото №7.  
Измерение уровня стен в  
спальне.

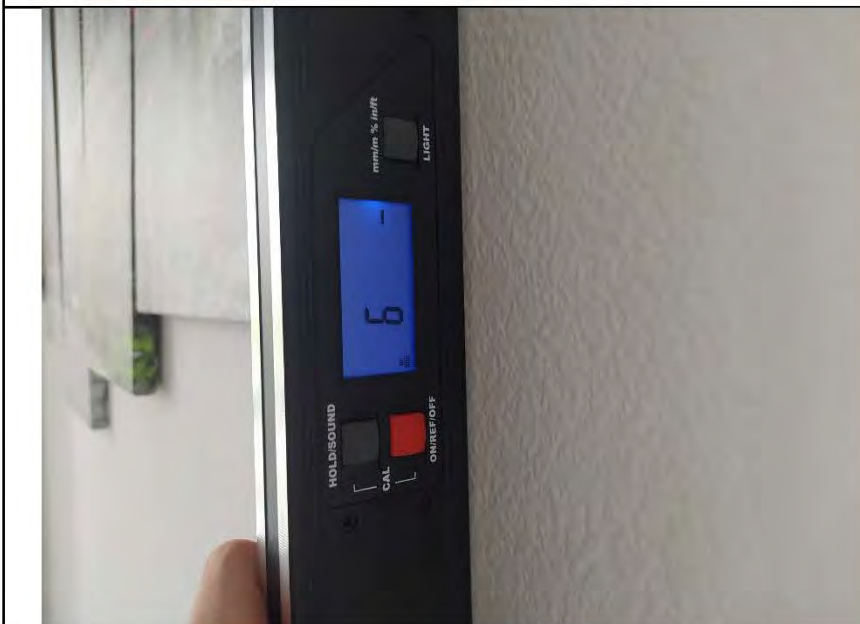


Фото №8.  
Измерение уровня стен в  
кухне.



Фото №9.  
Измерение уровня стен в  
гостиной.



Фото №10.  
Измерение уровня стен в  
прихожей.



Фото №11.  
Измерение уровня стен в  
ванной комнате  
(керамическая плитка).

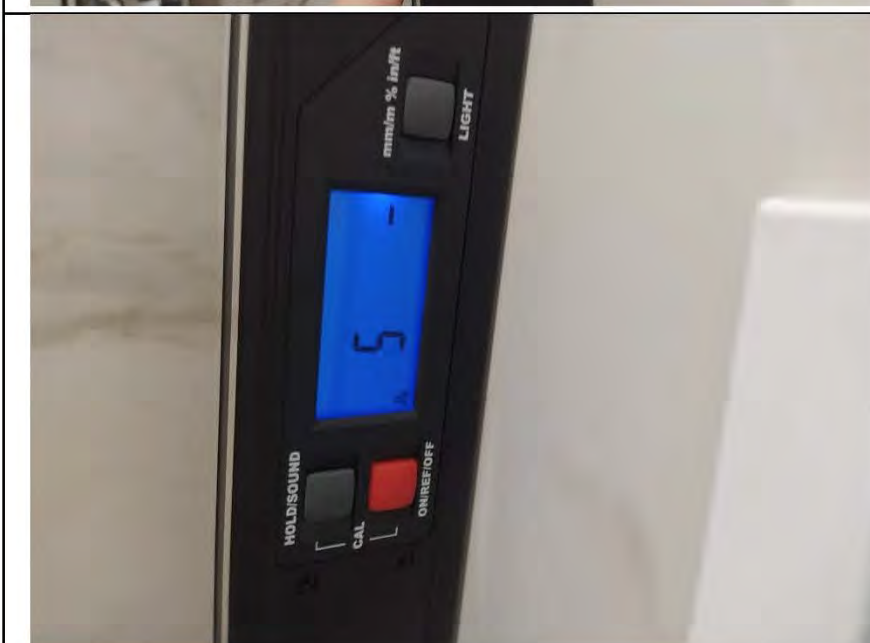


Фото №12.  
Измерение уровня стен в  
санузле (керамическая  
плитка).



Фото №13.  
Измерение уровня  
напольного покрытия в  
спальне.



Фото №14.  
Измерение уровня  
напольного покрытия в  
гостиной



Фото №15.  
Измерение уровня  
напольного покрытия в  
кухне.





Фото №16.  
Измерение уровня  
напольного покрытия в  
прихожей.



Фото №17.  
Измерение уровня  
напольного покрытия в  
ванной комнате  
(керамическая плитка).



Фото №18.  
Измерение уровня  
напольного покрытия в  
санузле (керамическая  
плитка).

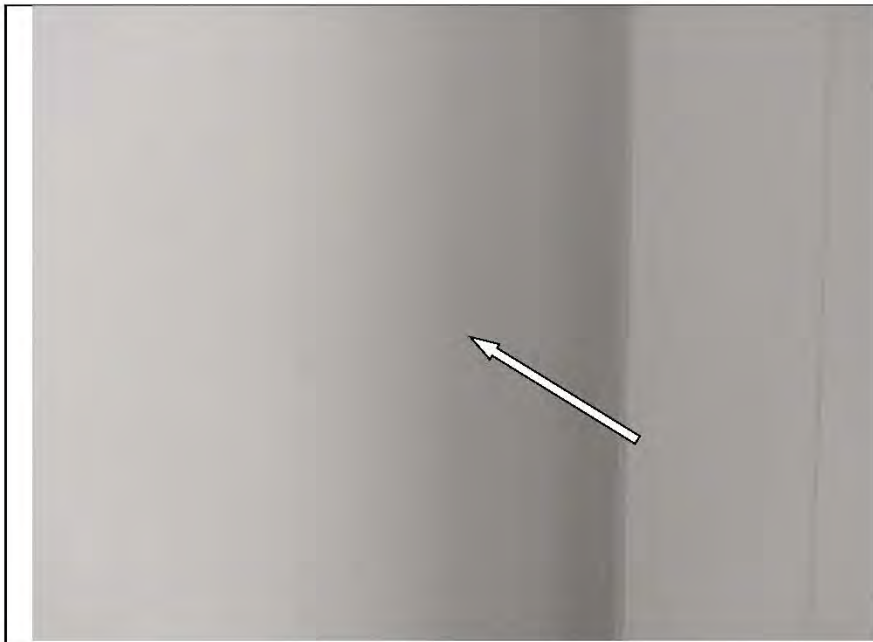


Фото №19.  
Окрашенные откосы оконного блока ПВХ №1 в гостиной выполнены с дефектами (трещина).

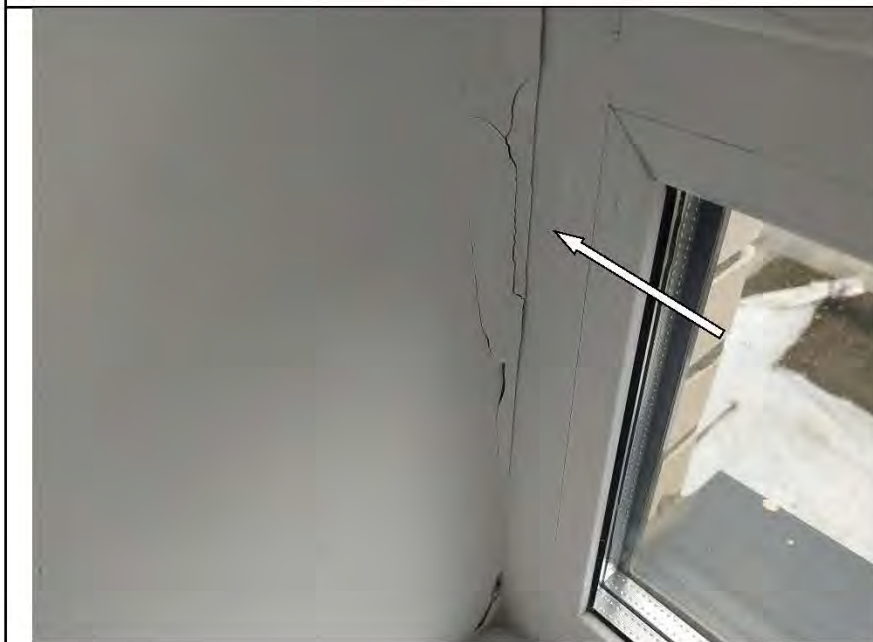


Фото №20.  
Окрашенные откосы оконного блока ПВХ №2 в гостиной выполнены с дефектами (отлупы).

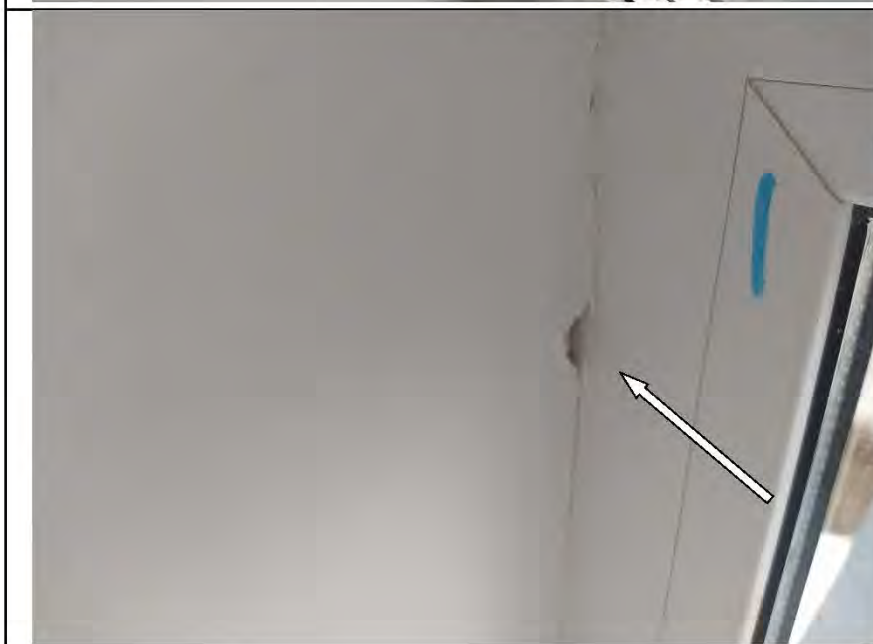


Фото №21.  
Окрашенные откосы оконного блока ПВХ в спальне выполнены с дефектами (отлупы).



Фото №22.  
Окрашенные откосы оконного блока ПВХ в кухне выполнены с дефектами (отлупы).



Фото №23.  
Профиль ПВХ оконного блока №1 в гостиной имеет дефекты (притертость).



Фото №24.  
Профиль ПВХ оконного блока №1 в гостиной имеет дефекты (сколы).



Фото №25.  
Профиль ПВХ оконного блока №1 в гостиной имеет дефекты (сколы).



Фото №26.  
Профиль ПВХ оконного блока №2 в гостиной имеет дефекты (сколы).



Фото №27.  
Профиль ПВХ оконного блока №2 в гостиной имеет дефекты (сколы).



Фото №28.  
Профиль ПВХ оконного блока №2 в гостиной имеет дефекты (царапина).



Фото №29.  
Профиль ПВХ оконного блока в спальне имеет дефекты (скол).



Фото №30.  
Профиль ПВХ оконного блока в спальне имеет дефекты (царапины).



Фото №31.  
Профиль ПВХ оконного блока в кухне имеет дефекты (скол).

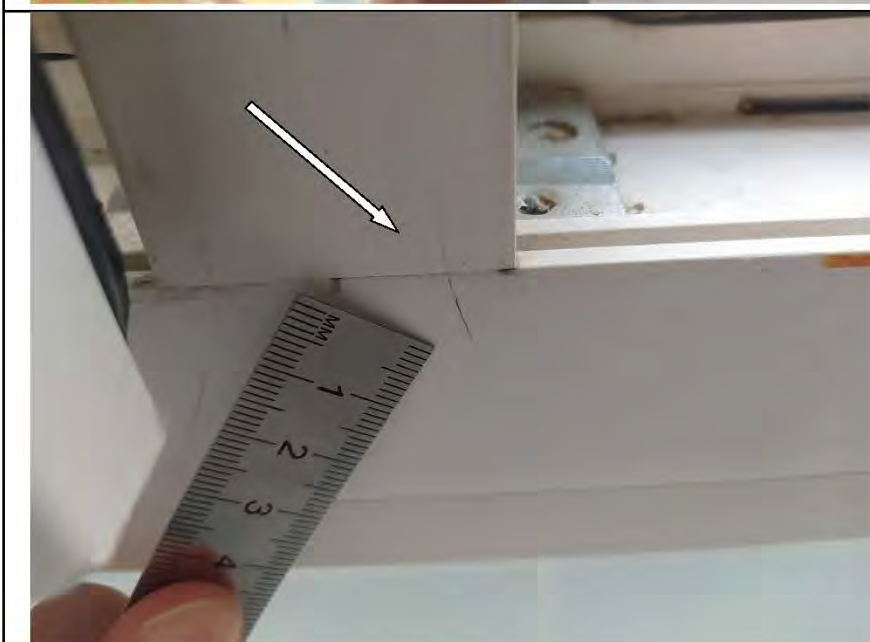


Фото №32.  
Профиль ПВХ оконного блока в кухне имеет дефекты (царапина).



Фото №33.  
На лицевой поверхности подоконной доски в кухне имеются дефекты (царапины).

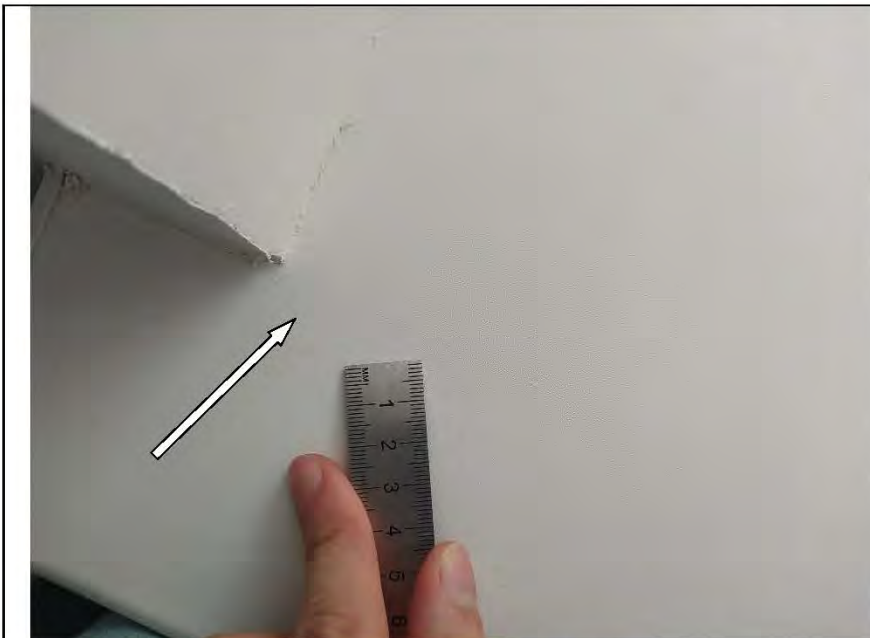


Фото №34.  
На лицевой поверхности  
подоконной доски в  
гостиной имеются дефекты  
(царапины).



Фото №35.  
Металлический отлив  
оконного блока ПВХ в  
гостиной имеет дефекты  
(загрязнение малярными  
составами)



Фото №36.  
Металлический отлив  
оконного блока ПВХ в  
спальне имеет дефекты  
(загрязнение малярными  
составами)



Фото №37.  
Отклонение коробки  
дверного блока в кухне.

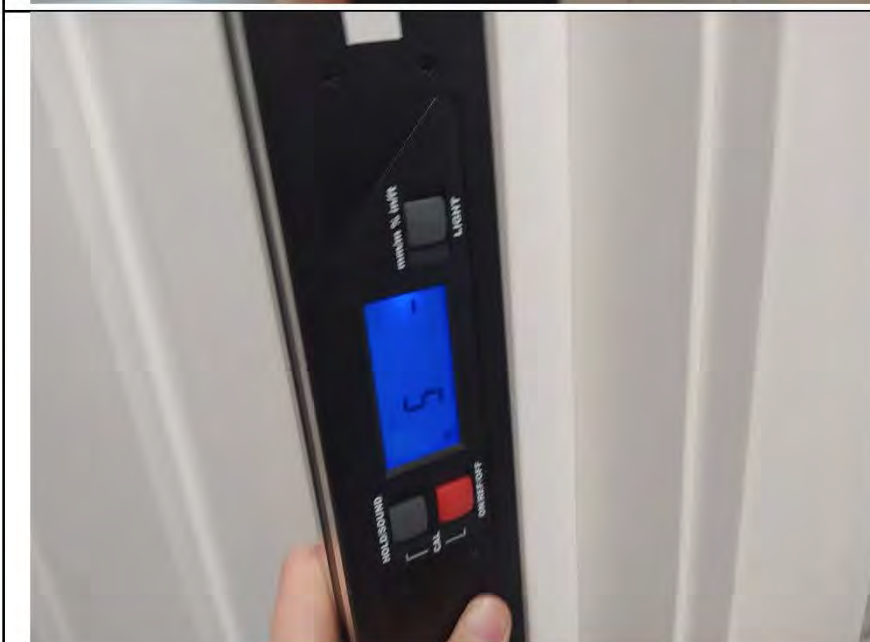


Фото №38.  
Отклонение коробки  
дверного блока в ванной  
комнате.

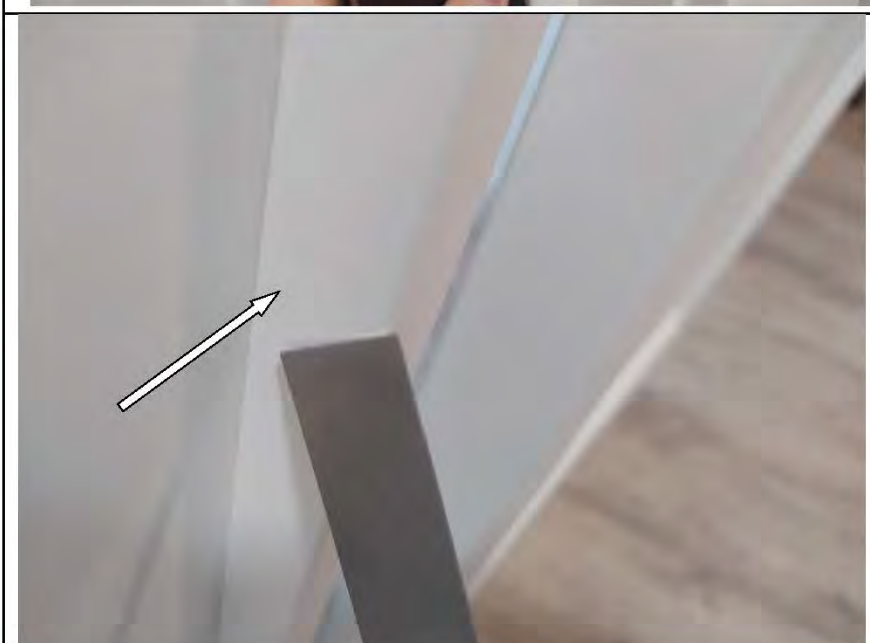


Фото №39.  
Коробка деревянного  
дверного блока в санузле  
имеет дефекты (скол).



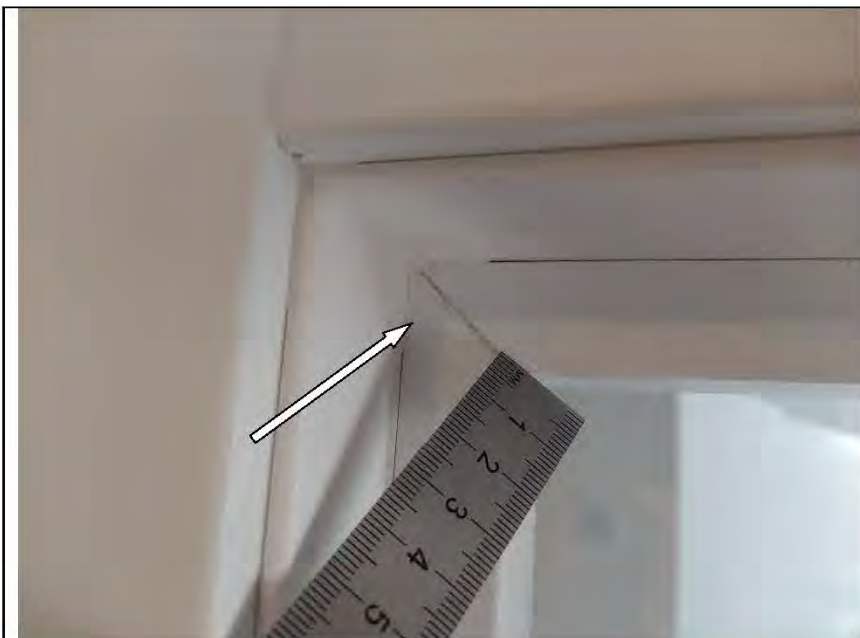


Фото №40.  
Элементы дверного блока соединены (коробка) не надежно в гостиной.

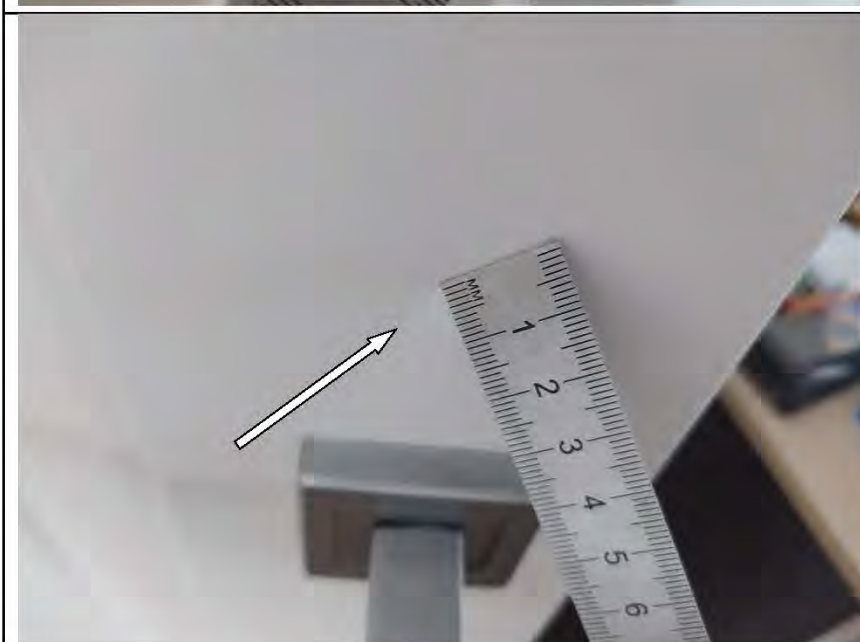


Фото №41.  
Дефекты (царапина) на лицевой поверхности полотна деревянного дверного блока в гостиной

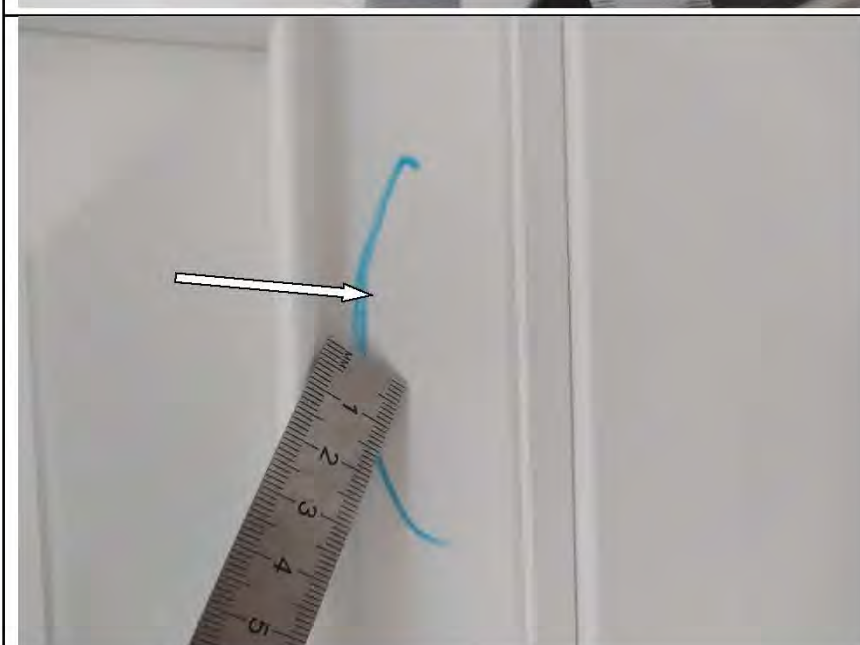


Фото №42.  
Дефекты (царапина) на лицевой поверхности полотна деревянного дверного блока в спальне



Фото №43.  
Дефекты (скол) на лицевой поверхности полотна деревянного дверного блока в кухне



Фото №44.  
Неплотное прилегание дверного наличника к стене в ванной комнате.



Фото №45.  
Неплотное прилегание дверного наличника к стене в кухне.



Фото №46.  
Неплотное прилегание  
дверного наличника к  
стене в гостиной.



Фото №47.  
Неплотное прилегание  
дверного наличника к  
стене в санузле.



Фото №48.  
Затирка настенной плитки  
в ванной комнате  
выполнена с нарушениями  
(разность ширины шва).



Фото №49.  
Затирка настенной плитки  
в санузле выполнена с  
нарушениями (каверны).



Фото №50.  
Затирка напольной плитки  
выполнена с нарушениями  
в санузле: разность  
ширины шва.



Фото №51.  
Затирка напольной плитки  
выполнена с нарушениями  
в ванной комнате: наличие  
монтажных элементов.



Фото №52.  
Загрязнения на  
поверхности ламината в  
спальне.



Фото №53.  
Загрязнения на  
поверхности ламината в  
кухне.



Фото №54.  
Загрязнения на  
поверхности ламината в  
гостиной.

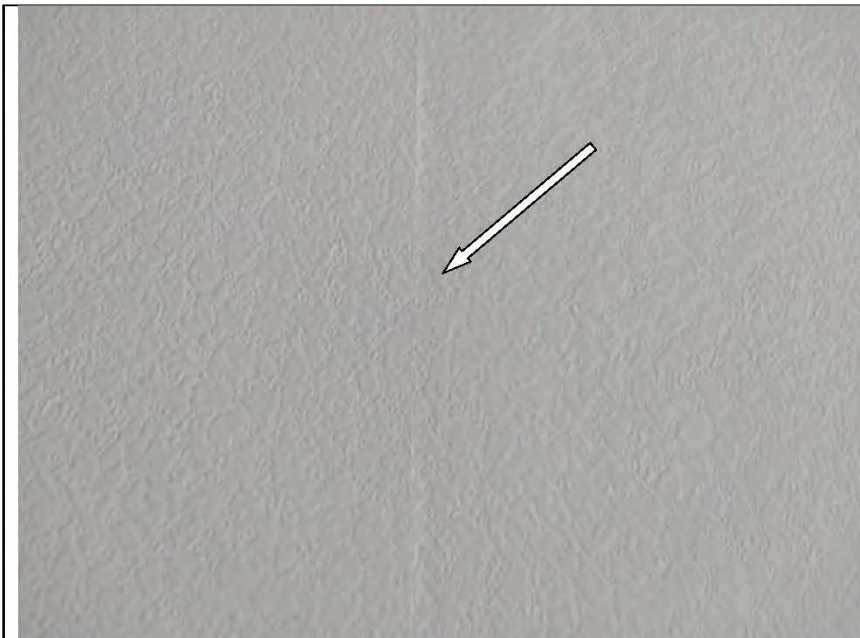


Фото №55.  
Читаемые швы обоев в  
кухне.



Фото №56.  
Читаемые швы обоев в  
спальне.



Фото №57.  
Читаемые швы обоев в  
гостиной.

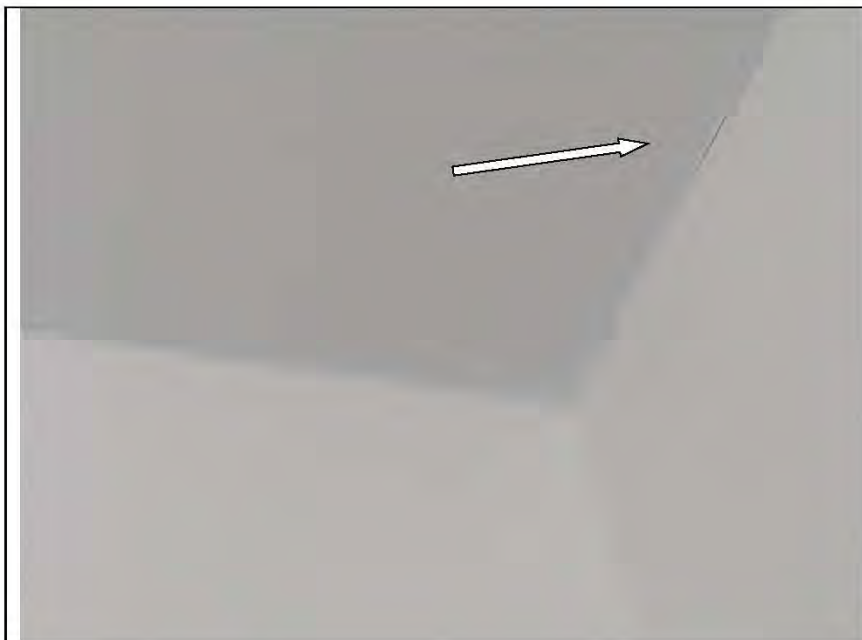


Фото №58.  
Дефект монтажа  
декоративного молдинга  
натяжного потолка в  
гостиной.



Фото №59.  
Загрязнение полотна  
натяжного потолка в  
спальне.



Фото №60.  
Дефект полотна натяжного  
потолка в кухне (видны  
инженерные сети).



Фото №61.  
Отопительный прибор имеет дефект защитного кожуха в спальне (скол)



Фото №62.  
Отопительный прибор имеет дефект защитного кожуха в гостиной (царапина)

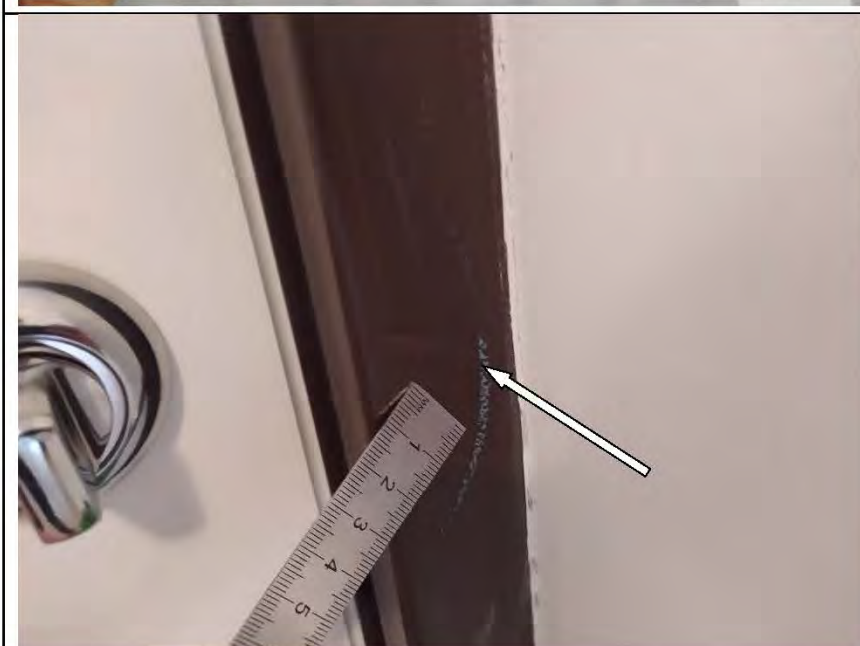


Фото №63.  
Коробка входной металлической двери имеет дефекты (царапины).





Фото №64.  
Дефекты (царапины) на  
лицевой поверхности  
полотна входного  
дверного блока.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр образовательной деятельности и  
лицензирования «МинМакс»  
(ООО «ЦОДЛ «МинМакс»)

Лицензия № 039895 от 08.02.2019

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО,  
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО

**7718770293121**

Документ о квалификации

Регистрационный №

**2211/61-01**

Дата выдачи

**09 ноября 2022 год**

Город

**Москва**

Настоящее свидетельство о том, что

**Кагарманов  
Руслан Сергеевич**

освоил(а) программу профессионального обучения

программу повышения квалификации рабочих, служащих  
по профессии: **Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования**  
в объеме **72 часов**

Решением аттестационной комиссии  
от **09 ноября 2022 года**

Присвоена квалификация  
**Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования**  
**4 (четвертого) разряда**



Председатель  
аттестационной комиссии

Руководитель  
образовательной организации

МП



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭКСПЕРТОВ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ»  
Регистрационный № РОСС RU. 31792.04ПСЭ0 от 22.11.2017

№ PS 003507

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

Действителен с « 24 » марта 2023 г. по « 24 » марта 2026 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

**Кагарманов Руслан Сергеевич**

Физ.лицо/Юр.лицо

СЕРТИФИЦИРОВАН(А) В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ  
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТОВ  
В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИМЕЕТ ПРАВО  
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ.

- 16.1 «Исследования строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью определения их стоимости»  
16.2 «Исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью установления его причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий труда»  
16.3 «Исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела между собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка вариантов указанного раздела»  
16.4 «Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств»  
16.5 «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий»  
16.6 «Исследования помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта»

Руководитель органа  
по сертификации

подпись

**Симулина А.И.**  
инициалы, фамилия



Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**Кагарманов  
Руслан Сергеевич**

с 11 ноября 2022 г. по 24 марта 2023 г.  
прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)  
Институте непрерывного образования  
по дополнительной профессиональной программе

«Судебная строительно-техническая  
и стоимостная экспертиза  
объектов недвижимости»

Решением аттестационной комиссии  
от 24 марта 2023 г.  
диплом предоставляет право  
на ведение профессиональной деятельности в сфере  
строительно-технической и стоимостной  
экспертизы объектов недвижимости

Частное образовательное  
учреждение дополнительного профессионального образования  
«Институт непрерывного образования»

# ДИПЛОМ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

373100485624

Документ о квалификации

Регистрационный номер

195-2023

Города

Иваново

Дата выдачи

24.03.2023



Руководитель

Секретарь

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 81216

Настоящим удостоверением подтверждается, что

**Кагарманов Руслан Сергеевич**

(фамилия, имя, отчество)

прошел(а) обучение в

Центральных Строительных Училищах

НОЧУ дополнительного

образования

профессионального образования

"Столичный институт экономики

и финансов"

по специализации

Ценообразование и сметное дело в

строительстве

и получил(а) знания и навыки в соответствии с программой курса.

Васин С.Г.

(И.И.О.)

Чмелева Г.С.

(И.И.О.)

Лицензия № 039467

г. Москва, 16 марта 2023 года.



# УДОСТОВЕРЕНИЕ

Приложение №3. Сертификаты, свидетельства о поверке.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**«ИСКАТЕЛЬ-2»**

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

**СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ**  
 Calibration certificate

**Номер сертификата** 0883/R  
 Certificate number

**Дата калибровки** 10.03.2023 г.  
 Date when calibration

**Объект калибровки** Уровень цифровой ADA ProLevel 60  
 Item calibrated

**Серийный номер** BN/14579

**Заказчик** ООО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО "ВОТУМ" ИНН 9706015686  
 Customer Информация о заказчике, адрес/name of the customer, address

**Наименование эталона / description of measurement standard**  
3.2.АКЗ.0129.2019, 3.2.АКЗ.0123.2019, 3.2.АКЗ.0138.2019

**Методика калибровки** 002.2016.274.КЦ21  
 Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся национальными эталонами ВНИИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частично воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.  
 All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI.

**Условия калибровки / Calibration conditions**  
Температура окружающего воздуха 22°С, Относительная влажность воздуха 56%

**Результаты калибровки**  
 Calibration results

Наименование	Результат калибровки*	Примечание
Уровень цифровой ADA ProLevel 60	соответствует	-

\* Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КЦ21

**Рекомендуемый межкалибровочный интервал:** 12 месяцев.  
 Подпись лица, выполнившего калибровку  
 Signature of the person who has performed calibration

  
 подпись / signature

Карпов Л.Е., Техник МС  
 ФИО и должность / name and function

  
10.03.2023 г.  
 Дата выдачи/ date of issue  
**И2 № Г 26295**

## Сведения о результатах поверки СИ

Регистрационный номер типа СИ	57786-17
Тип СИ	РГК D30, РГК D50, РГК D60, РГК D80, РГК D100, РГК D120
Наименование типа СИ	Дальномеры лазерные
Заводской номер СИ	21L102399
Модификация СИ	РГК D60

## Сведения о поверке

Наименование организации-поверителя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОГРЕСС-М" (ООО "АВТОПРОГРЕСС-М")
Условный номер знака поверки	АЦМ
Владелец СИ	-
Тип поверки	Первичная
Дата поверки СИ	20.09.2022
Поверка действительна до	19.09.2023
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка	Дальномеры лазерные РГК D30, РГК D50, РГК D60, РГК D80, РГК D100, РГК D120, 001 МП
СИ пригодно	Да
Номер свидетельства	С-АЦМ/20-09-2022/18732724
Знак поверки в паспорте	Нет
Знак поверки на СИ	Нет

## Средства поверки

### Средства измерений, применяемые в качестве эталона

36469.07.ЗР.00258049; 36469.07.Ленты измерительные эталонные 3-го разряда; Нет данных; 50 м; 926УС; 2008; ЗР; Эталон 3-го разряда; Приказ от 29 декабря 2018 года № 2Б40
82995.21.ПР.00473964; 82995.21.Тахеометр электронный; Leica TS30; Нет модификации; 364046; 2012; ПР; Эталон 1-го разряда; Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений; Приказ 2831 от 29.12.2018 г.



Выкопировка из Федерального информационного реестра по обеспечению единства измерений  
Росстандарта («Аршин»)

**10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие линейки требованиям ГОСТ 427-75 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.


Адрес завода: 454008, г. Челябинск, Свердловский тр-т, 38  
Тел/факс: 8(351) 211-60-61, 211-01-91.

**11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ**

Поверка выполнена, по результатам первичной поверки линейка измерительная металлическая признана пригодной и допущена к эксплуатации.

Поверительная клеймо   
Поверитель  **Е.М. Краева**  
(подпись, печать)  
Дата поверки « 12 » декабря 2022 г.

ООО НПФ «ЧИЗ»



**ПАСПОРТ**  
Линейка измерительная  
металлическая  
ГОСТ 427-75

Государственный реестр средств измерений № 96266-16

**1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

1.1 Линейка измерительная металлическая с пределами измерений до 3000 мм, с ценой деления 1 мм предназначена для абсолютных измерений линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой.

1.2 Пример обозначения измерительной линейки с пределом измерений 300 мм:

Линейка -300 ГОСТ 427-75

то же, с пределом измерений 1000 мм с двумя шкалами:

Линейка -1000 д ГОСТ 427-75

**2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

2.1 Линейки изготавливаются с пределами измерений: 150; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 3000 мм.

2.2 Линейки изготавливаются с одной и двумя шкалами.

2.3 Допускаемые отклонения см. табл. 1

**3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

3.1 Линейка – 1 шт.

3.2 Паспорт – 1 шт.



Таблица 1

Общая длина шкалы и расстояние между любым штрихом и началом или концом шкалы, мм	Допускаемые отклонения, мм
До 300	± 0,10
« 300 до 500	± 0,15
« 500 « 1000	± 0,20
« 1000 « 1500	± 0,25
« 1500 « 2000	± 0,30
« 2000 « 3000	± 0,60

**4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Линейку допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от -10 до +40 °С и относительной влажности воздуха - не более 98% при температуре +25 °С.

**5 ПОРЯДОК РАБОТЫ**

5.1 Удалить смазку с поверхностей линейки тканью, смоченной в нефрасе, протереть сухой чистой тканью.

5.2 Следить за чистой поверхностью линейки, оберегать линейку от попадания на нее влаги, пыли и грязи.

5.3 После работы линейку протереть тканью, смоченной в нефрасе, протереть сухой салфеткой.

**6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

6.1 Хранить линейку в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80% при температуре +25 °С.

6.2 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

**7 МЕТОДЫ ПОВЕРКИ**

7.1 Поверка линейек по МИ 2024-89.

7.2 Интервал между поверками – 1 год.

**8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Линейка – 300 д  
(обозначение)  
И24537  
(инвентарный номер)

Дата выпуска « 12 » ноября 2022 г.


Подпись лица, ответственного за приемку  м.п.

**9 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ**

Линейка подвергнута консервации по варианту В3-1/ВУ-1 ГОСТ 9.014 и упакована согласно ГОСТ 13762.

Категория условий хранения – 1(Л) по ГОСТ 15150.

Дата консервации и упаковки « 12 » ноября 2022 г.

Подпись лица, ответственного за консервацию и упаковку 

Срок консервации 24 месяца.

## Сведения о результатах поверки СИ

Регистрационный номер типа СИ	68600-17
Тип СИ	twoCOMP MAGNETIC_VARIO, VARIO Rostfrei, BASIC, ERGOLINE, STANDART, RADIUS
Наименование типа СИ	Рулетки измерительные металлические
Заводской номер СИ	STM-0210
Модификация СИ	VM1 twoCOMP MAGNETIC 5m (по 2 классу точности)
<b>Сведения о поверке</b>	
Наименование организации-поверителя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТИНТЕХ" (ООО "ТЕСТИНТЕХ")
Условный шифр знака поверки	ВЮМ
Владелец СИ	ООО "Экспертное бюро "Вотум"
Тип поверки	Периодическая
Дата поверки СИ	05.09.2022
Поверка действительна до	04.09.2023
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка	МИ 1780-87
СИ пригодно	Да
Номер свидетельства	С-ВЮМ/05-09-2022/183510944
Знак поверки в паспорте	Нет
Знак поверки на СИ	Нет

## Средства поверки

Средства измерений, применяемые в качестве эталона

1514.61.3P.00169159; 1514-61; Линейки контрольные рабочие; КЛ; Линейка контрольная с отсчетными лупами КЛ; 0196; 1902; 3P; Эталон 3-го разряда; Приказ Росстандарта №2840 от 29 декабря 2015 г.

## Доп. сведения

Поверка в сокращенном объеме

Нет

## Сведения о результатах поверки СИ

Реквизитный номер типа СИ	99641-15
Тип СИ	Тесто 606-1, Тесто 606-1
Наименование типа СИ	Индикатор влажности
Заводской номер СИ	481719040820
Идентификация СИ	Измеритель влажности Testo 606-1
<b>Сведения о поверке</b>	
Наименование организации поверителя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКАТЕЛЬ.Э" (ООО "ИСКАТЕЛЬ.Э")
Условие и цифр знака поверки	АКЗ
Владелец СИ	ООО "Экспертис Бюро. Восток"
Тип поверки	Периодическая
Дата поверки СИ	14.02.2023
Поверка действительна до	13.02.2024
Наименование документа, на основании которого выдана поверка СИ пригодно	М.П. П. 1952-2004
Число знаков знака	Да
Знак поверки в паспорте	С-АКЗ/М-02-2023-2023/035598
Знак поверки на СИ	Нет
Знак поверки на СИ	Нет

## Средства поверки

54193.М.ЗР.00061158_64854-30_Пирометры (Валюс нив, НугиРил, НугиСод МТ, НугиСод СИ, НЛ 200, НЛ 10, СТЗ, НР234, 6738979); 2019_2Р; Э-канал 2 по радрам; Бюджетная поверочная таблица сменитель влажности (масса и температура) лабораторного использования	Средства измерений, примененные в качестве эталона
63039.10_Термометры (микрошаг, 756	Средства измерений, примененные при поверке

101590-56_Светодиодный, 21322	
3738-76_Барометр-анализатор петролеопродуктов, 1007	
25575-08_Контрольные измерительные, 18-07572	

## Доп. сведения

Поверка в сформированном объеме	Да
Классификация качества обмена поверки	аккумулятор от +10°С до + 50°С; от 15% до 85% СЕ
Примечания	Поверка с применением эталонов: 3.2.АКЗ.30691.2019, 3.2.АКЗ.10157.2019, 3.2.АКЗ.10166, 2019, 3.2.АКЗ.10166, 2019, 3.2.АКЗ.0145.2019, 2019) и
Протокол поверки	Паспорт поверки

## Сведения о результатах поверки СИ

Регистрационный номер типа СИ	55677-15
Тип СИ	Терм 556-1, Терм 556-2
Наименование типа СИ	Индерма-инженерия
Знак оош – эмпр СИ	3807704/05610
Надпись на СИ	Терм 556-2
<b>Сведения о поверке</b>	
Наименование организации, осуществляющей поверку	УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТЕОРОЛОГИИ И КЛИМАТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТЕОЛОГИИ
Участие в акте поверки	С
Владелец СИ	ООО "Экспертная фирма "Эксперт" ИНН 073605586
Тип поверки	Периодическая
Дата поверки СИ	28.02.2023
Где была дана поверка на до	2102.0365
Наименование документа, на основании которого выдана поверка	МП от 19.12.2019 "Качеством в качестве Терм 556-1, Терм 556-2, Металлический баран"
С.М. Габриель	Да
Номер свидетельства	С-008-00-2003-02669904
Знак поверки в паспорте	Нис
Знак поверки на СИ	Нис
<b>Средства поверки</b>	
Стандартные образцы	
ГОСТ 8837-2005, СО ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРАХ НА ДОВ. 2023	
ГОСТ 1179-2013 (ИСО 4785-1), Устройства измерительные эталонные 1-го разряда массовый для объема в твердых веществах и металлах, ЭВМ 1-1, СО 2011-03, Российский эталон, Поверочные гиревые 19-2022 от 20.12.2018	Средства измерений, применяемые в качестве эталона
<b>Доп. сведения</b>	
Состояние СИ после поверки на поверку	
Где была в оверочной обмотке	Да
Качество работ по поверке СИ	качеством поверки эталонной температуры воздуха от 10 до 20 °С, в диапазоне температуры влажности воздуха от 5 до 85 %
Грехи сведения	Протокол PDF
Протокол поверки	Протокол поверки

Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал  
 ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»  
 (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)  
 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4  
 тел. +7 (343) 350 26 18, факс. +7 (343) 350 20 39, www.unim.ru E-mail: unim@unim.ru  
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311473

Протокол поверки № 33608 от 28 февраля 2023 г.

Средство измерения: измеритель влажности Testo 606-2  
 Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа: 5964 1-15  
 Заводской номер: 38777904/0820  
 Дата выпуска влагомера: 08.2020 г.  
 Заказчик: Юр лица  
 Принадлежит: ООО "Экспертное бюро "Вотум", ИНН 9706015686  
 Поверено в соответствии с: МП РТ 1995-2014 "Измерители влажности Testo 606-1, Testo 606-2  
 Методика поверки"  
 Вид поверки: периодическая  
 Дата проведения поверки: 28 февраля 2023 г.

Средства поверки:  
 Установка измерительная эталонная 1 разряда массовой доли влаги в твердых веществах и материалах ЭУВТ-1, зав. № 001, рег. №47685.11.РЭ.00431504, срок действия свидетельства о поверке № С-С/16-09-2022/186464789 до 15.09.2023 г.; ГСО 8837-2006 (образец 16), срок годности до 05.08.2023 г.; ГСО 8837-2006 (образец 4), срок годности до 19.07.2023 г.; термогигрометр электронный "Center" мод.313, зав. №100608708, срок действия свидетельства о поверке №С-СЕ/29-06-2022/167101611 до 28.06.2023 г.; барометр-анероид метеорологический БАММ-1, зав. № 507, свид-во о поверке № С-СЕ/19-07-2022/171940556, действительно до 18.07.2023 г.

**Условия проведения поверки:**

Температура окружающего воздуха, °С \_\_\_\_\_ 21,0  
 Относительная влажность воздуха, % \_\_\_\_\_ 50,1  
 Атмосферное давление, кПа \_\_\_\_\_ 96,5

**Результаты поверки:**

Результаты внешнего осмотра \_\_\_\_\_ удовлетворительно  
 Результаты опробования \_\_\_\_\_ удовлетворительно

**Определение метрологических характеристик (абсолютной погрешности) приведены в табл.1: Таблица 1**

Метрологические характеристики	Значение характеристики	
	по МП	действительное
Абсолютная погрешность измерения влажности материала, % от 7 до 12 % включ.	±1,5	1,2
	±2,5	2,4

Поверитель \_\_\_\_\_

И.И.Ильин, и.о. руководителя центра метрологической службы ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Ильин И.В.

Протокол поверки № 33608 от 28.02.2023 г.

стр. | из 2

**ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ**  
**Определение абсолютной погрешности**

Таблица 2

Наименование материала или ГСО	Аттестованное значение влажности (W <sub>0</sub> ), %	Показания прибора		
		Значения влажности (массовое отношение влаги) W <sub>из</sub> , %	W <sub>ср</sub> , %	Δ, %
Ель	7,7	8,3	8,5	0,8
		8,8		
		8,4		
		8,5		
		8,2		
Лиственница	8,5	8,5	8,6	0,1
		8,9		
		8,5		
		8,5		
		8,7		
Дуб	8,9	8,3	8,6	-0,3
		8,6		
		8,9		
		8,5		
		8,7		
Береза	9,0	9,2	9,1	0,1
		9,0		
		9,3		
		8,8		
		9,4		
ГСО 8837-2006 (обр 16) сосна	9,2	8,0	8,0	-1,2
		7,8		
		7,9		
		8,1		
		8,0		
Лиственница	11,2	10,5	10,4	-0,8
		10,3		
		10,6		
		10,1		
		10,2		
ГСО 8837-2006 (обр 4) сосна	13,8	12,3	12,3	-1,5
		12,0		
		12,6		
		12,5		
		12,5		
Ель	16,4	15,3	15,3	-1,1
		15,4		
		15,2		
		15,1		
		15,3		
Береза	15,9	14,5	14,4	-1,5
		14,0		
		14,7		
		14,3		
		14,6		
Дуб	17,6	16,8	16,9	-0,7
		17,0		
		16,9		
		16,7		
		17,2		
Лиственница	20,0	18,8	19,0	-1,0
		19,3		
		19,0		
		19,2		
		18,9		
Сосна	21,2	21,3	21,2	0,0
		21,5		
		20,8		
		21,2		
		21,0		
Лиственница	26,2	24,6	24,6	-1,6
		24,3		
		25,0		
		24,5		
		24,7		
Сосна	28,7	25,0	26,3	-2,4
		26,8		
		26,3		
		25,2		
		25,3		

Закл<sup>ю</sup>чение по результатам поверки: С.А. признано пригодным к применению  
 Выдано свидетельство о поверке УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» от 28 февраля 2023 г.  
 № \_\_\_\_\_  
 Поверитель: \_\_\_\_\_ Ильяш М.В.  
С.А. является федеральным эталоном влажности массового отношения влаги (W<sub>из</sub>) в единицах СИ (1000) Массы С. Менделеева  
С.А. является федеральным эталоном влажности массового отношения влаги (W<sub>из</sub>) в единицах СИ (1000) Массы С. Менделеева  
 Протокол поверки № 33608 от 28.02.2023 г. стр. 2 из 2  
 Конеч протокола

**Приложение №4 Документы экспертной организации.**

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от 4 марта 2019 г. N 86

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ**

«12» мая 2021 г.

№ 000000000000000000003493

**Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания»  
(Ассоциация СРО «МРИ»)**

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания

190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит А, 3 этаж, офис 62, <http://sro-mri.ru>, [info@sro-mri.ru](mailto:info@sro-mri.ru)

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-И-035-26102012

выдана Обществу с ограниченной ответственностью "Экспертное бюро "ВОТУМ"

Наименование	Сведения	
<b>1. Сведения о члене саморегулируемой организации:</b>		
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью "Экспертное бюро "ВОТУМ" (ООО "Экспертное бюро "ВОТУМ")	
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9706015686	
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1217700211750	
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	119180, РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, Муниципальный Округ Якиманка ВН.ТЕР.Г., пер 1-й Голутвинский, ., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком 1/12	
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---	
<b>2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:</b>		
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	3025	
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации	12 мая 2021 г.	
2.3. Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	12 мая 2021 г., №19-02-ПП/21	
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	12 мая 2021 г.	
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации	---	
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---	
<b>3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:</b>		
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства <b>выполнение инженерных изысканий,</b> подготовку проектной документации, строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса:	<b>выполнять инженерные</b> строительство, реконструкцию, по договору подряда на по договору подряда	
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной	в отношении объектов использования атомной энергии

атомной энергии)	энергии)	
12 мая 2021 г.	---	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на **выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый	<b>Есть</b>	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на **выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---

**4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:**

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Исполнительный директор  
М.П.



А.Ю. Базаров





## ВЫПИСКА

**из единого реестра членов саморегулируемых организаций, основанных  
на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, подготовку  
проектной документации**

**18.05.2021**

(дата)

**9706015686-18052021-1606**

(регистрационный номер выписки)

Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д.21, ИНН 7704311291

№ п/п	Наименование	Сведения
с 12.05.2021 является членом СРО Ассоциация Саморегулируемая организация "МежРегионИзыскания" (СРО-И-035-26102012)		
1	Сведения о члене саморегулируемой организации: идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное наименование юридического лица, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления деятельности, регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов	9706015686, Общество с ограниченной ответственностью "Экспертное бюро "ВОТУМ", ООО "Экспертное бюро "ВОТУМ", 119180, РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, Муниципальный Округ Якиманка ВН.ТЕР.Г., пер 1-Й Голутвинский, ., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I, 12.05.2021
2	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	12.05.2021 19-02-ПП/21 12.05.2021
3	Дата и номер решения об исключении из	

	членов саморегулируемой организации, основания исключения	
4	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:	
	а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);	Да
	б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);	Нет
	в) в отношении объектов использования атомной энергии	Нет
5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
6	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
7	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства	Нет



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ**  
**«РосПромСертификация»**  
**№ РОСС RU.32047.04РОПО**

**Орган по сертификации:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПрофСтройСтандарт»  
115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, этаж 2, пом. 209,  
8 (495) 221-78-07, prof.ISO@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ RPS.RU.3511.21**

**Выдан**

**Обществу с ограниченной ответственностью**  
**«Экспертное бюро «ВОТУМ»**

**ИНН 9706015686**

**119180, г. Москва., Муниципальный Округ Якиманка ВН.ТЕР.Г., пер 1-Й**  
**Голутвинский., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I/12**

Настоящий сертификат удостоверяет:

Применительно к работам по инженерным изысканиям

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
**ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать систему менеджмента в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем Органа по сертификации систем менеджмента ООО «ПрофСтройСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**Дата выдачи:** 12 мая 2021 г.

**Действителен до:** 12 мая 2024 г.

**Руководитель органа по сертификации**  
**систем менеджмента**

М.П.



Володина А.А.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы «ПрофСтройСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ**  
**«РосПромСертификация»**  
№ РОСС RU.32047.04РОПО

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА**  
Общество с ограниченной ответственностью  
**«ПрофСтройСтандарт»**  
115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, этаж 2, пом. 209,  
8 (495) 221-78-07, prof.ISO@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ**  
**О ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО**  
**ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ**  
**№ RPS.RU.4771.23**

Выдан  
Обществу с ограниченной ответственностью  
**«Экспертное бюро «ВОТУМ»**

**ИНН 9706015686**

Настоящий сертификат удостоверяет:

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

Применительно к работам по инженерным изысканиям

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
**ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

В ходе проведенной ежегодной инспекционной проверки экспертной комиссией органа по сертификации системы «РосПромСертификация» установлено, что состояние выполняемых работ находится в соответствии с вышеуказанным стандартом

Дата выдачи: 6 марта 2023 г.

Действителен до: 6 марта 2024 г.

Руководитель органа по сертификации  
систем менеджмента

М.П.



Володина А.А.



## Приложение №5. Локальный сметный расчет.

Наименование  
стройки:

Ремонтные работы. г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, кв.

Локальная смета №ЭФ3930/07-23

Составлена в ценах Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №203 август 2023 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Зар. платы	Экспл. машин
				Основной зар.платы	в т.ч. зар.платы			в т.ч. зар.платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел: Стены</b>								
1	6.63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных <i>100 м2 оклеенной поверхности</i>	1,2422	119,57	0,00	4364,72	4364,72	0,00
		Объем: 1,2422=124,22/100 Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к ОЗП Коэфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП	6.63-6-1 28,67 28,67 100 64	119,57 76,52	0,00	3622,72 1789,54	83 41	0,00 0,00
2	3.15-165-1	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения <i>100 м2</i>	1,2422	52,80	0,82	1908,77	1897,38	11,39
		Объем: 1,2422=124,22/100 Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к ОЗП Коэфф. к эксплуатации машин Коэфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП	3.15-165-1 28,67 10,95 28,67 100 64	52,80 33,36	0,82 0,14	1574,83 777,93	83 41	5,16
2,1	1.1-1-3108	Грунтовка акрилатная, водно-дисперсионная, с высокой проникающей способностью, паропроницаемая, для всех видов впитывающих оснований, светло-желтая <i>кг</i>	12,79466	17,66	0,00	903,80	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам	1.1-1-3108 4	0,00	0,00			0,00
3	3.15-55-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен <i>100 м2</i>	1,2422	378,58	11,73	13655,89	13259,88	369,17
		Объем: 1,2422=124,22/100 Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к ОЗП Коэфф. к эксплуатации машин Коэфф. к материалам Коэфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП	3.15-55-3 28,67 24,71 5,99 28,67 100 64	372,12 238,16	8,88	11005,70 5436,55	83 41	324,26
3,1	1.3-2-29	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных	1,05587	1517,68	0,00	11585,86	0,00	0,00

		работ, для ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	<i>m</i>		0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.3-2-29						
		Козфф. к материалам	7,23						
3,2	1.1-1-2854	Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием		12,79466	28,98	0,00	1327,43	0,00	0,00
			<i>кг</i>		0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-2854						
		Козфф. к материалам	3,58						
4	3.15-61-1	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных		1,2422	118,88	5,96	4027,02	3855,83	96,17
		<i>100 м2 отделяваемой поверхности</i>			105,63	1,41			51,61
		Объем: 1,2422=124,22/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.15-61-1						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	12,67						
		Козфф. к материалам	8,28						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	100		107,04		3200,34	83	
		% СП	64		68,51		1580,89	41	
		Итого с НР и СП			294,43		8808,25		
4,1	1.1-1-118	Вода		0,013913	7,07	0,00	0,60	0,00	0,00
			<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-118						
		Козфф. к материалам	6						
4,2	1.3-2-165	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75		0,079501	1774,21	0,00	868,87	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.3-2-165						
		Козфф. к материалам	6,16						
4,3	1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75		0,049688	481,69	0,00	214,89	0,00	0,00
			<i>м3</i>		0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.3-2-13						
		Козфф. к материалам	8,98						
5	3.15-127-2	Оклейка обоями тисненными и плотными стен по монолитной штукатурке и бетону		1,2422	830,06	31,93	21593,22	19039,17	441,16
		<i>100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности</i>			521,56	4,79			174,89
		Объем: 1,2422=124,22/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.15-127-2						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	10,85						
		Козфф. к материалам	6,15						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	100		526,35		15802,51	83	
		% СП	64		336,86		7806,06	41	
		Итого с НР и СП			1693,27		45201,79		
5,1	1.1-1-4105	Обои виниловые на флизелиновой основе рельефные, под покраску		1,453374	945,51	0,00	8602,37	0,00	0,00
			<i>100 м2</i>		0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-4105						
		Козфф. к материалам	6,26						
6	3.15-96-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		1,2422	350,88	32,01	11996,45	11417,83	516,02

			100 м2 окрашиваемой поверхности		312,78	7,56		276,09
		Объем: 1,2422=124,22/100						
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.15-96-6				
		Коэфф. к ОЗП		28,67				
		Коэфф. к эксплуатации машин		12,66				
		Коэфф. к материалам		8,28				
		Коэфф. к ЗПМ		28,67				
		% НР		100	320,34		9476,80	83
		% СП		64	205,02		4681,31	41
		Итого с НР и СП			876,24		26154,56	
6,1	1.1-1-1478	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая		0,006832	13953,60	0,00	302,20	0,00
			m		0,00	0,00		0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.1-1-1478				
		Коэфф. к материалам		3,17				
6,2	1.1-1-438	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17		0,078259	22652,13	0,00	3651,82	0,00
			m		0,00	0,00		0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.1-1-438				
		Коэфф. к материалам		2,06				
7	6.63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		0,2626	781,64	0,00	6161,47	6161,47
			100 м2 облицовки		781,64	0,00		0,00
		Объем: 0,2626=26,26/100						
		Коэфф. пересчёта: пункт		6.63-7-5				
		Коэфф. к ОЗП		28,67				
		Коэфф. к ЗПМ		28,67				
		% НР		80	625,31		4313,03	70
		% СП		55	429,90		2526,20	41
		Итого с НР и СП			1836,85		13000,70	
8	3.15-55-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		0,2626	378,58	11,73	2886,84	2803,07
			100 м2		363,24	8,88		78,08
		Объем: 0,2626=26,26/100						
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.15-55-3				
		Коэфф. к ОЗП		28,67				
		Коэфф. к эксплуатации машин		24,71				
		Коэфф. к материалам		5,99				
		Коэфф. к ЗПМ		28,67				
		% НР		100	372,12		2326,55	83
		% СП		64	238,16		1149,26	41
		Итого с НР и СП			988,86		6362,65	
8,1	1.1-1-2854	Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием		6,565	28,98	0,00	681,10	0,00
			кг		0,00	0,00		0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.1-1-2854				
		Коэфф. к материалам		3,58				
8,2	1.3-2-29	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм		0,22321	1517,68	0,00	2449,23	0,00
			m		0,00	0,00		0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.3-2-29				
		Коэфф. к материалам		7,23				
9	3.15-13-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		0,2626	3108,01	29,03	19927,28	18150,40
								98,87



			100 м2 поверхности облицовки	2352,00	6,86		53,04		
		Объем: 0,2626=26,26/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.15-13-1						
		Коэфф. к ОЗП	28,67						
		Коэфф. к эксплуатации машин	12,66						
		Коэфф. к материалам	8,79						
		Коэфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	100	2358,86		15064,83	83		
		% СП	64	1509,67		7441,66	41		
		Итого с НР и СП		6976,54		42433,77			
9,1	1.3-2-199	Смесь сухая, мелкозернистая, известковая с натуральным наполнителем и щелочестойкими светостойкими пигментами, затирочная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, насыпная плотность 1500 кг/м3, прочность на сжатие не менее 10 МПа, для заделки и реставрации швов шириной от 5 до 30 мм в кладке из кирпича или натурального камня		7,878	36,92	0,00	1861,50	0,00	0,00
			кг		0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.3-2-199						
		Коэфф. к материалам	6,4						
9,2	1.1-1-840	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, гладкие		26,26	52,32	0,00	8779,35	0,00	0,00
			м2		0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-840						
		Коэфф. к материалам	6,39						
10	3.15-139-1	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси		0,2626	745,91	0,00	5754,86	5754,36	0,00
			100 м2 облицовываемой поверхности		745,68	0,00			0,00
		Объем: 0,2626=26,26/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.15-139-1						
		Коэфф. к ОЗП	28,67						
		Коэфф. к материалам	8,26						
		Коэфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	100	745,68		4776,12	83		
		% СП	64	477,24		2359,29	41		
		Итого с НР и СП		1968,83		12890,27			
10,1	1.3-2-32	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм		0,003414	5631,52	0,00	169,99	0,00	0,00
			т		0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.3-2-32						
		Коэфф. к материалам	8,84						
<b>Итого по разделу: Стены</b>							<b>240387,65</b>	<b>86704,11</b>	<b>1610,86</b>
									<b>953,57</b>
			<b>Раздел: Напольное покрытие</b>						
11	6.57-3-1	Разборка плитусов		0,496	38,53	0,00	573,69	573,69	0,00
			100 м плитусов		38,53	0,00			0,00
		Объем: 0,496=49,6/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт	6.57-3-1						
		Коэфф. к ОЗП	28,67						
		Коэфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	80	30,82		401,58	70		
		% СП	55	21,19		235,21	41		
		Итого с НР и СП		90,55		1210,48			
12	3.11-29-3	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих		0,496	283,59	6,73	1388,69	1193,82	30,01

			<i>100 м плитусов</i>	80,19	0,64			9,46
		Объем: 0,496=49,6/100						
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.11-29-3					
		Коэфф. к ОЗП	28,67					
		Коэфф. к эксплуатации машин	8,6					
		Коэфф. к материалам	1,69					
		Коэфф. к ЗПМ	28,67					
		% НР	104	84,06		1038,62	87	
		% СП	70	56,58		489,47	41	
		Итого с НР и СП		424,23		2916,78		
12,1	1.1-1-289	Плитус напольный, ПВХ, с кабель-каналом, высота от 55 до 62 мм, толщина от 22 до 25 мм	49,6	22,18	0,00	1573,19	0,00	0,00
			<i>м</i>	0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-289					
		Коэфф. к материалам	1,43					
13	3.11-37-1	Демонтаж покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом	0,40448	591,21	43,13	3918,01	3401,12	216,68
			<i>100 м2</i>	280,12	8,51			103,21
		Объем: 0,40448=(50,56/100)*0,8						
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.11-37-1					
		Коэфф. к ОЗП	28,67					
		Коэфф. к эксплуатации машин	11,86					
		Коэфф. к материалам	2,77					
		Коэфф. к ЗПМ	28,67					
		% НР	104	300,18		2958,97	87	
		% СП	70	202,04		1394,46	41	
		Итого с НР и СП		1093,43		8271,44		
14	3.11-10-11	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	0,5056	482,58	65,87	6329,07	5941,28	341,73
			<i>100 м2 стяжки</i>	391,47	9,19			139,34
		Объем: 0,5056=50,56/100						
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.11-10-11					
		Коэфф. к ОЗП	28,67					
		Коэфф. к эксплуатации машин	9,8					
		Коэфф. к материалам	3,61					
		Коэфф. к ЗПМ	28,67					
		% НР	104	416,69		5168,91	87	
		% СП	70	280,46		2435,92	41	
		Итого с НР и СП		1179,73		13933,90		
14,1	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	10,112	17,31	0,00	747,42	0,00	0,00
			<i>кг</i>	0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-3257					
		Коэфф. к материалам	4,27					
14,2	1.3-2-175	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки пола ручным и механизированным способом, самовыравнивающиеся, марка 200	0,425715	2401,10	0,00	4150,05	0,00	0,00
			<i>т</i>	0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.3-2-175					
		Коэфф. к материалам	4,06					
15	3.11-10-12	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-11	0,4126	53,46	9,10	588,21	545,88	41,62
			<i>100 м2 стяжки</i>	44,07	1,46			18,06
		Объем: 0,4126=(20,63/100)*2						

		Козфф. пересчёта: пункт	3.11-10-12						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	10,59						
		Козфф. к материалам	5,9						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	104	47,35		474,92		87	
		% СП	70	31,87		223,81		41	
		Итого с НР и СП		132,68		1286,94			
15,1	1.3-2-175	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки пола ручным и механизированным способом, самовыравнивающиеся, марка 200							
			0,069317	2401,10	0,00	675,75	0,00	0,00	
			<i>m</i>	0,00	0,00			0,00	
		Козфф. пересчёта: пункт	1.3-2-175						
		Козфф. к материалам	4,06						
16	3.11-37-1	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом							
			0,5056	591,21	43,13	4897,51	4251,47	270,76	
			<i>100 м2</i>	280,12	8,51			129,02	
		Объем: 0,5056=50,56/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.11-37-1						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	11,86						
		Козфф. к материалам	2,77						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	104	300,18		3698,78		87	
		% СП	70	202,04		1743,10		41	
		Итого с НР и СП		1093,43		10339,39			
16,1	1.1-1-2491	Ламинированное напольное покрытие (ламинат) на основе древесноволокнистых плит, бесклеевое, 32 класса воздействия нагрузки, толщина 8 мм							
			51,824	276,40	0,00	26356,44	0,00	0,00	
			<i>м2</i>	0,00	0,00			0,00	
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-2491						
		Козфф. к материалам	1,84						
17	6.57-2-7	Разборка покрытий из керамических плиток							
			0,0391	845,63	64,48	959,56	916,87	42,69	
			<i>100 м2 покрытия</i>	781,15	19,25			22,65	
		Объем: 0,0391=3,91/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	6.57-2-7						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	16,17						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	80	640,32		641,81		70	
		% СП	55	440,22		375,92		41	
		Итого с НР и СП		1926,17		1977,29			
18	3.11-10-11	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм							
			0,0391	482,58	65,87	489,61	459,58	26,46	
			<i>100 м2 стяжки</i>	391,47	9,19			10,89	
		Объем: 0,0391=3,91/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.11-10-11						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	9,8						
		Козфф. к материалам	3,61						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	104	416,69		399,83		87	
		% СП	70	280,46		188,43		41	
		Итого с НР и СП		1179,73		1077,87			

18,1	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	0,782	17,31	0,00	57,82	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.1-1-3257	0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам		4,27					
18,2	1.3-2-175	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки пола ручным и механизированным способом, самовыравнивающиеся, марка 200	т	0,032922	2401,10	0,00	320,94	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.3-2-175	0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам		4,06					
19	3.11-10-12	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-11		0,0279	53,46	9,10	39,90	36,98	2,86
		Объем: 0,0279=2,79/100			44,07	1,46			1,15
		Козфф. пересчёта: пункт		3.11-10-12					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,59					
		Козфф. к материалам		5,9					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		104	47,35		32,17	87	
		% СП		70	31,87		15,16	41	
		Итого с НР и СП			132,68		87,23		
19,1	1.3-2-175	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки пола ручным и механизированным способом, самовыравнивающиеся, марка 200	т	0,004687	2401,10	0,00	45,68	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.3-2-175	0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам		4,06					
20	3.11-18-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных		0,0391	2451,94	162,37	1881,36	1426,91	85,45
		Объем: 0,0391=3,91/100			1215,82	39,82			46,73
		Козфф. пересчёта: пункт		3.11-18-2					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		12,85					
		Козфф. к материалам		8,79					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		104	1305,87		1241,41	87	
		% СП		70	878,95		585,03	41	
		Итого с НР и СП			4636,75		3707,80		
20,1	1.3-2-199	Смесь сухая, мелкозернистая, известковая с натуральным наполнителем и щелочестойкими светостойкими пигментами, затирочная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, насыпная плотность 1500 кг/м3, прочность на сжатие не менее 10 МПа, для заделки и реставрации швов шириной от 5 до 30 мм в кладке из кирпича или натурального камня	кг	1,173	36,92	0,00	277,18	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.3-2-199	0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам		6,4					
20,2	1.1-1-2398	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30x30 см, толщина 8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	3,9882	92,02	0,00	2752,43	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1.1-1-2398	0,00	0,00			0,00

21	3.15-139-1	Козфф. к материалам Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси	7,5	0,0391	745,91	0,00	856,74	856,66	0,00
		<i>100 м2 облицовываемой поверхности</i>			745,68	0,00			0,00
		Объем: 0,0391=3,91/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.15-139-1						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к материалам	8,26						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	100		745,68		711,03	83	
		% СП	64		477,24		351,23	41	
		Итого с НР и СП			1968,83		1919,00		
21,1	1.3-2-199	Смесь сухая, мелкозернистая, известковая с натуральным заполнителем и щелочестойкими светостойкими пигментами, затирочная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, насыпная плотность 1500 кг/м3, прочность на сжатие не менее 10 МПа, для заделки и реставрации швов шириной от 5 до 30 мм в кладке из кирпича или натурального камня		0,5083	36,92	0,00	120,13	0,00	0,00
			кг		0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.3-2-199						
		Козфф. к материалам	6,4						
22	3.11-39-1	Демонтаж металлической накладной полосы (порожка)		0,012	249,29	14,65	71,35	68,23	1,22
		<i>100 м</i>			189,38	0,77			0,29
		Объем: 0,012=(2/100)*0,6							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.11-39-1						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	6,79						
		Козфф. к материалам	3,51						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	104		197,76		59,36	87	
		% СП	70		133,11		27,97	41	
		Итого с НР и СП			580,15		158,68		
23	3.11-39-1	Укладка металлической накладной полосы (порожка)		0,02	249,29	14,65	119,11	113,82	2,10
		<i>100 м</i>			189,38	0,77			0,57
		Объем: 0,02=2/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.11-39-1						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	6,79						
		Козфф. к материалам	3,51						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	104		197,76		99,02	87	
		% СП	70		133,11		46,67	41	
		Итого с НР и СП			580,15		264,80		
23,1	1.7-12-44	Порог одноуровневый, алюминиевый, тип крепления открытый, с элементами крепежа, ширина 30 мм, высота 2,6 мм		2	16,07	0,00	283,47	0,00	0,00
			м		0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.7-12-44						
		Козфф. к материалам	8,82						
<b>Итого по разделу: Напольное покрытие</b>							<b>84213,11</b>	<b>19786,31</b>	<b>1061,58</b>
									<b>481,37</b>
<b>Раздел: Потолок</b>									
24	3.15-183-6	Демонтаж натяжного потолка: крепление, натяжка и фиксация полотна в багете гарпунным		0,2004	67,48	1,54	391,68	388,19	3,49

		способом								
			100 м2			65,94	0,29			1,72
		Объем: 0,2004=(25,05/100)*0,8								
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.15-183-6						
		Коэфф. к ОЗП		28,67						
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,92						
		Коэфф. к ЗПМ		28,67						
		% НР		100		66,23		322,20		83
		% СП		64		42,39		159,16		41
		Итого с НР и СП				176,10		873,04		
25	3.15-183-6	Устройство натяжного потолка: крепление, натяжка и фиксация полотна в багете гарпунным способом	0,2505			67,48	1,54	489,75	485,38	4,37
			100 м2			65,94	0,29			2,01
		Объем: 0,2505=25,05/100								
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.15-183-6						
		Коэфф. к ОЗП		28,67						
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,92						
		Коэфф. к ЗПМ		28,67						
		% НР		100		66,23		402,87		83
		% СП		64		42,39		199,01		41
		Итого с НР и СП				176,10		1091,63		
25,1	1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	0,106638			6,27	0,00	5,49	0,00	0,00
			кг			0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.1-1-2613						
		Коэфф. к материалам		8,2						
25,2	1.1-1-832	Пленка отделочная поливинилхлоридная, декоративная, марка ПДСО-15	27,555			17,82	0,00	491,03	0,00	0,00
			м2			0,00	0,00			0,00
26	3.15-183-6	Демонтаж декоративного молдинга гарпунным способом	0,15328			67,48	1,54	299,64	297,02	2,62
			100 м2			65,94	0,29			1,43
		Объем: 0,15328=(19,16/100)*0,8								
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.15-183-6						
		Коэфф. к ОЗП		28,67						
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,92						
		Коэфф. к ЗПМ		28,67						
		% НР		100		66,23		246,53		83
		% СП		64		42,39		121,78		41
		Итого с НР и СП				176,10		667,95		
27	3.15-183-6	Устройство декоративного молдинга гарпунным способом	0,1916			67,48	1,54	374,56	371,28	3,28
			100 м2			65,94	0,29			1,72
		Объем: 0,1916=19,16/100								
		Коэфф. пересчёта: пункт		3.15-183-6						
		Коэфф. к ОЗП		28,67						
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,92						
		Коэфф. к ЗПМ		28,67						
		% НР		100		66,23		308,16		83
		% СП		64		42,39		152,22		41
		Итого с НР и СП				176,10		834,94		
27,1	1.1-1-1503	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 22-32 мм	0,001839			17921,30	0,00	352,34	0,00	0,00
			м			0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		1.1-1-1503						
		Коэфф. к материалам		10,69						

27,2	1.1-1-3693	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	38,8948	10,60	0,00	836,93	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1,1-1-3693	0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам		2,03					
<b>Итого по разделу: Потолок</b>							<b>5153,35</b>	<b>1541,87</b>	<b>13,76</b>
<b>Раздел: Оконный блок</b>									
28	3.10-85-1	Демонтаж подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,0512	2555,75	10,75	920,82	342,61	6,35
		Объем: 0,0512=(6,4/100)*0,8			222,98	2,01			3,15
		Козфф. пересчёта: пункт		3,10-85-1					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,94					
		Козфф. к материалам		4,81					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		105	236,24		298,07	87	
		% СП		70	157,49		140,47	41	
		Итого с НР и СП			2949,48		1359,36		
29	3.10-85-1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,064	2555,75	10,75	1151,02	428,33	7,88
		Объем: 0,064=6,4/100			222,98	2,01			3,73
		Козфф. пересчёта: пункт		3,10-85-1					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,94					
		Козфф. к материалам		4,81					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		105	236,24		372,65	87	
		% СП		70	157,49		175,62	41	
		Итого с НР и СП			2949,48		1699,29		
29,1	1.9-12-115	Доски подоконные из ПВХ ламинированные декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20x400x6000 мм	м	6,528	156,88	0,00	3123,54	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1,9-12-115	0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам		3,05					
29,2	1.9-12-112	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ. цвет: белый, мрамор, размеры 40x480 мм	шт.	2,048	10,42	0,00	104,57	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт		1,9-12-112	0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам		4,9					
30	3.10-84-6	Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема более 2 м2	100 м2	0,08552	8700,82	291,63	6358,25	4345,23	272,59
		Объем: 0,08552=(10,69/100)*0,8			1692,64	49,39			126,72
		Козфф. пересчёта: пункт		3,10-84-6					
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,44					
		Козфф. к материалам		3,03					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		105	1829,13		3780,35	87	
		% СП		70	1219,42		1781,54	41	
		Итого с НР и СП			11749,37		11920,14		

31	3.10-84-6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема более 2 м2	0,1069	8700,82	291,63	7947,83	5431,53	340,76
		100 м2		1692,64	49,39			158,55
		Объем: 0,1069=10,69/100						
		Козэфф. пересчёта: пункт	3.10-84-6					
		Козэфф. к ОЗП	28,67					
		Козэфф. к эксплуатации машин	10,44					
		Козэфф. к материалам	3,03					
		Козэфф. к ЗПМ	28,67					
		% НР	105	1829,13		4725,43	87	
		% СП	70	1219,42		2226,93	41	
		Итого с НР и СП		11749,37		14900,19		
31,1	1.1-1-3078	Лента пароизоляционная, самоклеящаяся, уплотнительная, бутилкаучуковая, дублированная нетканым полотном с двух сторон, прочность сцепления не менее 0,03 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +90°, ширина 70 мм, для защиты монтажной пены от увлажнения внутри помещения, препятствует образованию конденсата на поверхности внутренних откосов при монтаже оконных и дверных блоков, светопрозрачных конструкций	6,14675	13,06	0,00	94,73	0,00	0,00
		Козэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-3078	0,00	0,00			0,00
		Козэфф. к материалам	1,18					
31,2	1.1-1-2980	Лента гидроизоляционная, паропроницаемая, герметизирующая, бутилкаучуковая, на основе пародиффузионной мембраны, с клеящими неотверждаемыми слоями герметика с двух краев, прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +80°С, теплостойкость до +180°С, пенетрация при 0,1 мм от 3 до 90, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм, для вентиляции и защиты от проникновения влаги в стык различных конструкций, отделки под отлив, наружная герметизация примыканий оконных и дверных блоков к стеновому проему и защиты теплоизоляционного слоя	26,56465	14,75	0,00	528,97	0,00	0,00
		Козэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-2980	0,00	0,00			0,00
		Козэфф. к материалам	1,35					
31,3	1.1-1-2984	Лента предварительнонажатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 10/4	10,69	6,48	0,00	65,81	0,00	0,00
		Козэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-2984	0,00	0,00			0,00
		Козэфф. к материалам	0,95					
31,4	1.9-1-192	Блоки оконные из ПВХ профилей "КБЕ", распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, марка ОП(КБЕ) 15-15Ф, двухстворчатые с форточкой, площадь 2,16м2, с импортной фурнитурой, для жилых домов серии КОПЭ	10,69	2007,24	0,00	98704,04	0,00	0,00
		Козэфф. пересчёта: пункт	1.9-1-192	0,00	0,00			0,00
		Козэфф. к материалам	4,6					
32	3.13-17-6	Очистка поверхности щетками	5,12	10,06	0,00	1546,17	1546,17	0,00
		Козэфф. пересчёта: пункт	3.13-17-6	10,06	0,00			0,00
		Козэфф. к материалам	28,67					
		Козэфф. к ЗПМ	28,67					
		% НР	100	10,06		1283,32	83	
		% СП	64	6,44		633,93	41	
		Итого с НР и СП		26,56		3463,42		
33	3.15-55-5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих	0,0512	957,08	16,42	1431,01	1407,41	21,98



		растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м2	935,43	12,78		19,21		
		Объем: 0,0512=5,12/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.15-55-5						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	25,56						
		Козфф. к материалам	6,01						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	100	948,21		1168,15	83		
		% СП	64	606,85		577,04	41		
		Итого с НР и СП		2512,14		3176,20			
33,1	1.1-1-3108	Грунтовка акрилатная, водно-дисперсионная, с высокой проникающей способностью, паропроницаемая, для всех видов впитывающих оснований, светло-желтая	кг	0,52736	17,66	0,00	37,24	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-3108		0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам	4						
33,2	1.3-2-221	Смесь сухая штукатурная гипсовая с минеральными модифицирующими добавками, ручного нанесения, для внутренних работ, толщина наносимого слоя 5-50 мм, водоудерживающей способностью свыше 99%, без содержания SiO2, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80%, белизна не менее 80%	кг	62,976	3,17	0,00	680,74	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.3-2-221		0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам	3,41						
34	3.15-96-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен		0,0512	493,76	29,03	711,90	690,09	19,24
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>			458,64	6,86			10,32
		Объем: 0,0512=5,12/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.15-96-3						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	12,66						
		Козфф. к материалам	8,28						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	100	465,50		572,77	83		
		% СП	64	297,92		282,94	41		
		Итого с НР и СП		1257,18		1567,61			
34,1	1.1-1-1478	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	м	0,002611	13953,60	0,00	115,48	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-1478		0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам	3,17						
34,2	1.1-1-438	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	м	0,003226	22652,13	0,00	150,54	0,00	0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.1-1-438		0,00	0,00			0,00
		Козфф. к материалам	2,06						
<b>Итого по разделу: Оконный блок</b>							<b>139938,72</b>	<b>14191,37</b>	<b>668,80</b>
									<b>321,68</b>
<b>Раздел: Дверной блок</b>									
35	6.56-38-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных	100 м2	0,0606	966,19	0,00	1757,47	1757,47	0,00
		Объем: 0,0606=6,06/100			966,19	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	6.56-38-3						
		Козфф. к ОЗП	28,67						

		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		80	772,95		1230,23	70	
		% СП		55	531,40		720,56	41	
		Итого с НР и СП			2270,55		3708,26		
36	3.10-21-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2		0,0606	2904,54	274,98	3369,34	2460,17	190,90
					1352,40	51,41			93,46
		Объем: 0,0606=6,06/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.10-21-3						
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,94					
		Козфф. к материалам		9,28					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		105	1474,00		2140,35	87	
		% СП		70	982,67		1008,67	41	
		Итого с НР и СП			5361,21		6518,36		
36,1	1.9-7-5	Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезной защелкой с фиксатором, размер дверного проема 2070x710 мм, площадь 1,39 м2		6,06	460,36	0,00	22987,79	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.9-7-5						
		Козфф. к материалам		8,24					
36,2	1.9-12-41	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74x13 мм		32,724	5,69	0,00	1320,16	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	1.9-12-41						
		Козфф. к материалам		7,09					
37	3.10-21-1	Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2		0,0117	3555,61	454,29	675,26	379,88	57,43
					1081,50	53,91			18,92
		Объем: 0,0117=(1,95/100)*0,6							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.10-21-1						
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,31					
		Козфф. к материалам		10,07					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		105	1192,18		330,50	87	
		% СП		70	794,79		155,75	41	
		Итого с НР и СП			5542,58		1161,51		
38	3.10-21-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2		0,0195	3555,61	454,29	1125,37	633,03	95,68
					1081,50	53,91			31,54
		Объем: 0,0195=1,95/100							
		Козфф. пересчёта: пункт	3.10-21-1						
		Козфф. к ОЗП		28,67					
		Козфф. к эксплуатации машин		10,31					
		Козфф. к материалам		10,07					
		Козфф. к ЗПМ		28,67					
		% НР		105	1192,18		550,74	87	
		% СП		70	794,79		259,54	41	
		Итого с НР и СП			5542,58		1935,65		
38,1	1.7-2-272	Блок дверной стальной внутренний, однопольный, с утеплителем, стальной замкнутой коробкой, цилиндрическим замком, глазком, ручками, противосъемными штырями, двумя		1,0335	1723,11	0,00	13890,47	0,00	0,00

контурами резинового уплотнителя, петлями наружными с шарикоподшипником, толщина стали 1,5 мм с наружной отделкой полимерно-порошковым напылением, внутренняя отделка из влагостойкой ламинированной панели МДФ, размеры 2060x960 мм			<i>шт.</i>	1.7-2-272	0,00	0,00			0,00
Козфф. пересчёта: пункт				7,8					
Козфф. к материалам									
<b>Итого по разделу: Дверной блок</b>							<b>51284,15</b>	<b>5230,55</b>	<b>344,01</b>
<b>Раздел: Разное</b>									
39	6.65-12-1	Демонтаж радиатора массой до 80 кг	<i>100 шт.</i>	0,04	1290,31	0,00	1549,33	1549,33	0,00
Объем: 0,04=4/100					1290,31	0,00			0,00
Козфф. пересчёта: пункт				6.65-12-1					
Козфф. к ОЗП				28,67					
Козфф. к ЗПМ				28,67					
% НР				80	1032,25		1084,53	70	
% СП				55	709,67		635,23	41	
Итого с НР и СП					3032,23		3269,09		
40	3.18-6-2	Установка радиаторов стальных	<i>100 кВт радиаторов и конвекторов</i>	0,02194	1626,63	157,05	728,06	466,46	46,85
Объем: 0,02194=(1,097/100)*2					695,02	37,58			25,23
Козфф. пересчёта: пункт				3.18-6-2					
Козфф. к ОЗП				28,67					
Козфф. к эксплуатации машин				12,73					
Козфф. к материалам				12,64					
Козфф. к ЗПМ				28,67					
% НР				110	805,86		419,81	90	
% СП				74	542,12		191,25	41	
Итого с НР и СП					2974,61		1339,12		
40,1	1.21-5-726	Кожухи стальные	<i>шт.</i>	0,2194	903,34	0,00	1654,89	0,00	0,00
Козфф. пересчёта: пункт				1.21-5-726					
Козфф. к материалам				8,35					
41	3.18-6-2	Установка радиаторов стальных	<i>100 кВт радиаторов и конвекторов</i>	0,02194	1626,63	157,05	728,06	466,46	46,85
Объем: 0,02194=(1,097/100)*2					695,02	37,58			25,23
Козфф. пересчёта: пункт				3.18-6-2					
Козфф. к ОЗП				28,67					
Козфф. к эксплуатации машин				12,73					
Козфф. к материалам				12,64					
Козфф. к ЗПМ				28,67					
% НР				110	805,86		419,81	90	
% СП				74	542,12		191,25	41	
Итого с НР и СП					2974,61		1339,12		
42	6.65-4-3	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	<i>100 компл.</i>	0,02	1681,68	0,00	1009,47	1009,47	0,00
Объем: 0,02=2/100					1681,68	0,00			0,00
Козфф. пересчёта: пункт				6.65-4-3					
Козфф. к ОЗП				28,67					
Козфф. к ЗПМ				28,67					
% НР				80	1345,34		706,63	70	

		% СП	55	924,92		413,88	41	
		Итого с НР и СП		3951,95		2129,98		
43	3.17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	42,93	3,72	1987,40	1696,69	100,60
				27,73	0,88			53,90
		1 комплект						
		Кoeff. пересчёта: пункт	3.17-3-1					
		Кoeff. к ОЗП	28,67					
		Кoeff. к эксплуатации машин	12,67					
		Кoeff. к материалам	8,28					
		Кoeff. к ЗПМ	28,67					
		% НР	110	31,47		1527,02	90	
		% СП	74	21,17		695,64	41	
		Итого с НР и СП		95,57		4210,06		
44	6.65-4-6	Демонтаж санитарно-технических приборов ванн стальных	0,01	2281,05	0,00	684,64	684,64	0,00
				2281,05	0,00			0,00
		100 компл.						
		Объем: 0,01=1/100						
		Кoeff. пересчёта: пункт	6.65-4-6					
		Кoeff. к ОЗП	28,67					
		Кoeff. к ЗПМ	28,67					
		% НР	80	1824,84		479,25	70	
		% СП	55	1254,58		280,70	41	
		Итого с НР и СП		5360,47		1444,59		
45	3.17-1-13	Установка ванн купальных пластиковых	1	30,63	7,29	690,97	602,36	83,32
				19,69	1,19			36,41
		1 комплект						
		Кoeff. пересчёта: пункт	3.17-1-13					
		Кoeff. к ОЗП	28,67					
		Кoeff. к эксплуатации машин	10,71					
		Кoeff. к материалам	1,45					
		Кoeff. к ЗПМ	28,67					
		% НР	110	22,97		542,12	90	
		% СП	74	15,45		246,97	41	
		Итого с НР и СП		69,05		1480,06		
46	3.17-5-4	Демонтаж раковин	0,4	16,82	1,49	149,97	125,00	8,08
				10,22	0,35			4,30
		1 комплект						
		Объем: 0,4=1*0,4						
		Кoeff. пересчёта: пункт	3.17-5-4					
		Кoeff. к ОЗП	28,67					
		Кoeff. к эксплуатации машин	12,63					
		Кoeff. к материалам	8,28					
		Кoeff. к ЗПМ	28,67					
		% НР	110	11,63		112,50	90	
		% СП	74	7,82		51,25	41	
		Итого с НР и СП		36,27		313,72		
47	3.17-5-4	Установка раковин	1	16,82	1,49	374,89	312,50	20,08
				10,22	0,35			10,61
		1 комплект						
		Кoeff. пересчёта: пункт	3.17-5-4					
		Кoeff. к ОЗП	28,67					
		Кoeff. к эксплуатации машин	12,63					
		Кoeff. к материалам	8,28					
		Кoeff. к ЗПМ	28,67					
		% НР	110	11,63		281,25	90	
		% СП	74	7,82		128,13	41	
		Итого с НР и СП		36,27		784,27		

48	6.65-8-1	Смена смесителя с душем	100 компл.	0,01	2446,47	0,00	742,08	741,12	0,00
		Объем: 0,01=1/100			2423,06	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	6.65-8-1						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к материалам	4,17						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	110		2665,37		667,01	90	
		% СП	74		1793,06		303,86	41	
		Итого с НР и СП			6904,90		1712,95		
49	6.65-8-7	Смена смесителя без душа	100 приборов	0,01	1851,47	4,22	561,31	559,93	0,59
		Объем: 0,01=1/100			1830,33	0,84			0,29
		Козфф. пересчёта: пункт	6.65-8-7						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	11,88						
		Козфф. к материалам	4,63						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	110		2014,29		503,94	90	
		% СП	74		1355,07		229,57	41	
		Итого с НР и СП			5220,82		1294,82		
50	6.67-7-1	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки	100 шт.	0,2	59,68	0,00	358,38	358,38	0,00
		Объем: 0,2=20/100			59,68	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	6.67-7-1						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	80		47,74		250,87	70	
		% СП	55		32,82		146,94	41	
		Итого с НР и СП			140,25		756,19		
51	4.8-243-9	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,16	485,57	2,71	2198,41	2185,23	4,93
		Объем: 0,16=16/100			455,00	0,63			3,15
		Козфф. пересчёта: пункт	4.8-243-9						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	10,96						
		Козфф. к материалам	1,85						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	114		519,42		1726,33	79	
		% СП	67		305,27		895,94	41	
		Итого с НР и СП			1310,26		4820,68		
52	4.8-243-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,04	401,70	2,71	472,45	469,90	1,21
		Объем: 0,04=4/100			391,43	0,63			0,86
		Козфф. пересчёта: пункт	4.8-243-5						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	10,96						
		Козфф. к материалам	4,47						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	114		446,95		371,22	79	
		% СП	67		262,68		192,66	41	
		Итого с НР и СП			1111,33		1036,33		

53	4.8-280-2	Прокладка кабеля	100 м	0,25	2365,41	29,47	7586,60	3687,25	81,03
		Объем: 0,25=25/100			491,35	3,94			29,53
		Козфф. пересчёта: пункт	4.8-280-2						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	10,51						
		Козфф. к материалам	8,28						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	114		564,63		2912,93		79
		% СП	67		331,84		1511,77		41
		Итого с НР и СП			3261,88		12011,30		
54	14.8-26-6	Профилактические работы по уходу за строительными конструкциями, устранение грибов и плесени на поверхности строительных конструкций	1 м2 поверхности	10	59,39	1,04	6290,91	5536,18	87,15
		Козфф. пересчёта: пункт	14.8-26-6		19,31	0,07			20,07
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	8,38						
		Козфф. к материалам	1,71						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	100		19,38		4595,03		83
		% СП	64		12,40		2269,83		41
		Итого с НР и СП			91,17		13155,77		
55	3.47-1-4	Очистка участка от мусора	100 м2	0,406	39,96	0,00	487,10	487,10	0,00
		Объем: 0,406=40,6/100			39,96	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт	3.47-1-4						
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	156		62,34		448,13		92
		% СП	84		33,57		199,71		41
		Итого с НР и СП			135,86		1134,94		
56	6.66-87-1	Погрузка вручную мусора, приравненного к бытовому, в самосвал	1 т	0,9	93,77	75,68	1450,08	488,82	961,26
		Козфф. пересчёта: пункт	6.66-87-1		18,09	19,70			532,12
		Козфф. к ОЗП	28,67						
		Козфф. к эксплуатации машин	13,48						
		Козфф. к ЗПМ	28,67						
		% НР	91		34,39		366,62		75
		% СП	70		26,45		200,42		41
		Итого с НР и СП			154,61		2017,12		
		<b>Итого по разделу: Разное</b>					<b>55905,00</b>	<b>21426,82</b>	<b>1441,95</b>
		<b>Итого по смете: Ремонтные работы. г. Москва, ул. Маресьева, д. 7, корп. 3, кв.</b>					<b>576881,98</b>	<b>148881,03</b>	<b>741,70</b>
		<b>НДС 20%</b>							<b>116224,12</b>
		<b>Всего с НДС</b>							<b>697344,70</b>

Составил специалист, Р.С. Катарманов

Проверил генеральный директор, В.В. Иванова

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение № 6. Акт осмотра.

ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО

ВСТ

АКТ ОСМОТРА

Дата и время проведения осмотра: \_\_\_\_\_ 09.00

Объект осмотра: жилое помещение (квартира)

расположенный по адресу: г. Москва, ул. Марьинская,  
д. 7, к/д 3, кв.

Во время проведения осмотра присутствовали:

Эксперт

Караулов Р.С.  
(ФИО)

[подпись]  
(подпись)

Собственник/  
доверенное лицо

0  
(ФИО)

[подпись]  
(подпись)

Собственник/  
доверенное лицо

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## Приложение №7. Телеграмма.

ТЕЛЕГРАФ ОНЛАЙН

КОПИЯ ТЕЛЕГРАММЫ

МОСКВА 690049 88 07/08 1808=

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА УЛ НЕДУРУБОВА ДОМ 30 ПОМ 364 ООО СЗ НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ=

УВЕДОМЛЯЕМ ВАС О ПРОВЕДЕНИИ В 09:00 ОСМОТРА КВАРТИРЫ ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. МАРЕСЬЕВА, Д. 7, КОРП. 3, КВ. НЕЗАВИСИМЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ИР НЕК Т 01.07.2021 Г., ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. ПРОСИМ ВАС НАПРАВИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОСМОТР КВАРТИРЫ В УКАЗАННУЮ ДАТУ. :  
ООО ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО ВОТУМ-

ТЕЛЕГРАММА ОТПРАВЛЕНА С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА ТЕЛЕГРАФ ОНЛАЙН TELEGRAF.RU

КОПИЯ ВЕРНА НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ



*Смирнова Е.А.*

